

8.Выполнение работ (КС-2 и КС-6а)

Формирование выполнений – актов выполненных работ КС-2 (процентовка) и журнала выполненных работ КС-6а – производится на основе сметы.

При этом, программа позволяет оформлять акты выполненных работ при отсутствии, путем формирования объемов выполнения непосредственно в акте выполнения работ, по правилам формирования сметы.

Создание 100% выполнений

При выполнении работ в стопроцентном объеме, форму КС-2 можно распечатать непосредственно из проектной сметы. Для этого при экспорте в Excel/PDF выберите раздел "Акты выполненных работ", отметьте флажком нужную форму акта и нажмите "Выбрать"

Доступные документы

Сметы [0 из 20] **Акты [0 из 21]** Объектные сметы [0 из 2] Ресурсы [0 из 4] Форма КС-3 [0 из 1]

- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф)
- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф)
- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф) по двум уровням цен
- ☐ Акт СН-2012 по главам 1-5 (11 граф)
- ☐ Акт СН-2012 по главе 6 (11 граф)
- ☐ Акт КС-2 СН-2012 по главам 1-5 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 СН-2012 по главе 6 (12 граф)
- ☐ Акт КС-2 по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (13 граф) в ред. 557пр
- ☐ Акт КС-2 по ТЕР МО 421пр индексы построчно (13 граф) в ред. 557пр
- ☐ Акт КС-2 по ФСНБ 421пр для РИМ (13 граф) в ред. 557пр
- ☐ Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - построчная индексация
- ☐ Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - каталог текущих цен
- ☐ Акт для ТЕР (14 граф)
- ☐ Дефектная ведомость
- ☐ Акт на скрытые работы
- ☐ Акт 10 граф для РЖД


Сформировать Отмена Обновить Настроить >>

При продолжительном выполнении работ возникает необходимость формирования помесечных актов приемки выполненных работ КС-2, просмотра журнала учет выполненных работ КС-6а и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Также акты приемки выполненных работ используются при формировании Исполнительной сметы, Ресурсных расчетов и М-29. В этом случае следует создавать процентовки в программе так, как это будет описано далее.

Создание акта КС-2

Создание нового акта выполнения работ производится одним из нескольких способов:

- в структурной части из контекстного меню сметы выберите пункт "Добавить" – "Акт КС-2";
- выделите нужную смету, затем на панели инструментов нажмите ;
- при помощи сочетания клавиш <Ctrl+2>;
- выделите нужную смету и в содержательной части нажмите на кнопку  **Акт КС-2**

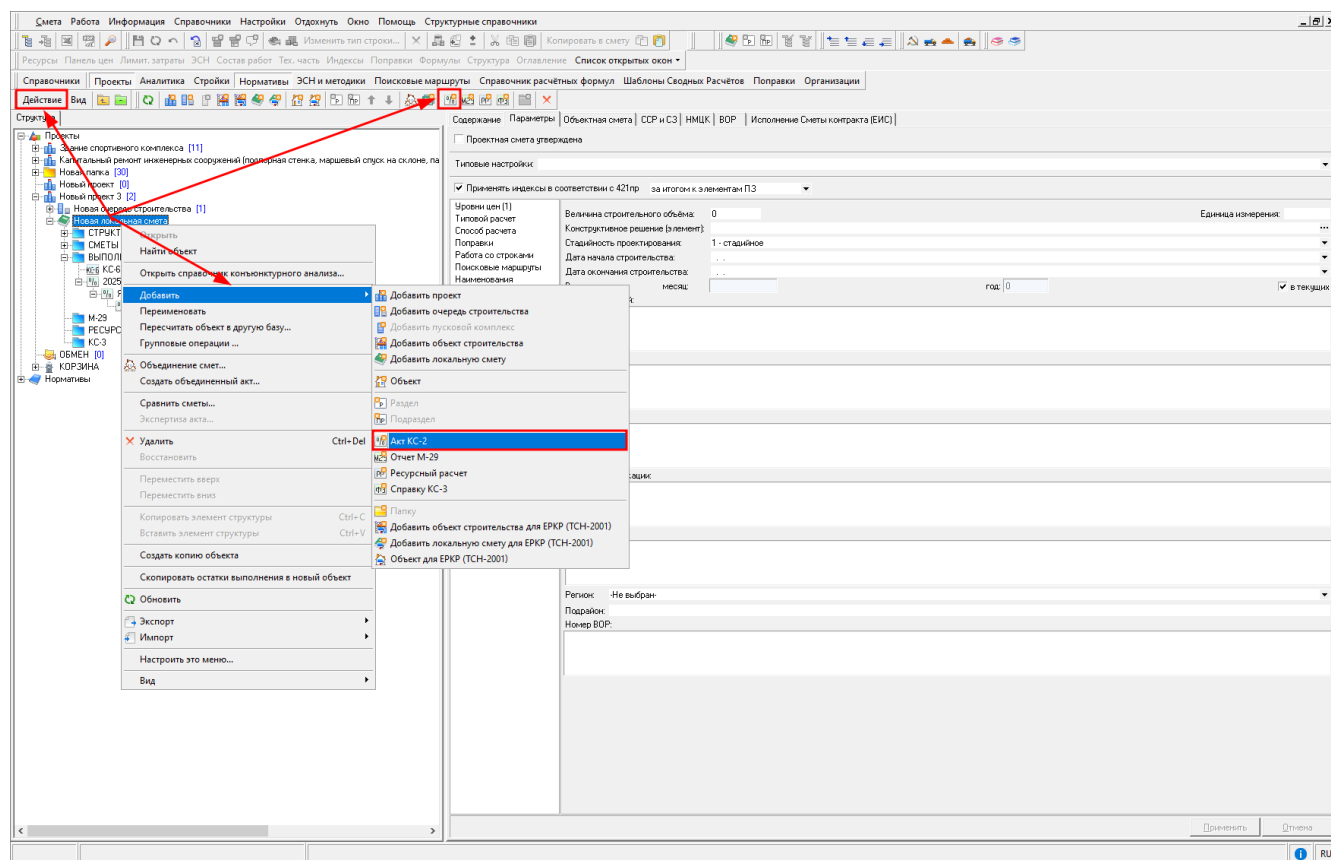

Создание выполнения осуществляется через окно "Мастера создания акта". На первом шаге мастера необходимо выбрать локальные сметы, по которым составляется акт выполненных работ

Создание акта

Шаг 1. Выбор локальных смет, по которым создается акт

Выбор ЛС	Наименование	Утверждена
☒	Устройство котлована	

 По всему объекту

На втором шаге мастера необходимо задать параметры акта: исполнитель работ, период (месяц и год) выполнения, название. Кроме того, при создании первого акта необходимо указать уровни цен, которые будут скопированы из сметы. Для последующих актов эти уровни цен будут копироваться из предыдущего акта. Показатели пересчета сметной стоимости для уровней цен копируются из параметров уровня в смете

Создание акта

Шаг 2. Основные параметры акта

Укажите подрядчика

Организация: ▼ ...

ФИО: ▼ ...

Должность:

Год: 2025 ▼ Месяц: Январь ▼

Наименование

Шифр

< Назад Готово Отмена

После создания акта можно поменять параметры уровней цен, например, если необходимо изменить показатели пересчета сметной стоимости.

При формировании выполнения копируются строки из сметы, а также дополнительные работы, добавленные в предыдущих актах.

В базисный уровень цен копируются индексы, базовые и единичные цены из соответствующей строки в проектной смете (либо доп. работы в предыдущем акте). Для текущего уровня цен индексы на строках приравниваются к 1. При необходимости в параметрах акта для текущего уровня могут быть заданы необходимые показатели пересчета стоимости (сборник индексов, индексы по смете в целом, вид цен).

Внешне окно акта напоминает режим сметы

Смета																									Работа		Информация		Справочники		Настройки		Открытые		Оформление		Помощь		Структурные справочники									
Ресурсы																									Панель цен		Лимит. затраты		ЭСН		Состав работ		Тех. часть		Индексы		Конъюнктурный		Поправки		Формулы		Структура		Список открытых окон		Базовый уровень цен/Текущий уровень цен	
Таб	Удт	№п/п по смете	№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. Краткая	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Процент выполнения	Всего	Выполнено	Осталось	Базовый уровень цен																																			
													Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭПМ	СтМат	Прочие	НР	СП	ТрудСтр	ТрудМаш	Всего	ПЗ																							

В акте добавлены графы:

- № п/п по смете – содержит номер каждой сметной строки в смете, если работа была добавлена в актах, то будет указано "Выполнение";
- Всего – отражает общий объем работ, предусмотренный сметой;
- Выполнено – суммарный объем выполнения по итогам предыдущих актов; объемы текущего акта здесь не учитываются;
- Процент выполнения - суммарный объем выполнения по итогам предыдущих актов в процентах; объемы текущего акта здесь не учитываются;
- Осталось – вычисляется как разность между значениями в графах "Всего" и "Выполнено";
- Всего с коэф. - в эту графу следует вводить объемы выполнения работ за отчетный период. Объемы выполнения можно вводить как числовыми показателями, так и в процентах от проектного объема

Для отображения нужных уровней цен в акте, нажмите в панели инструментов на выпадающее меню. Выберите уровни цен и нажмите "Применить"

В акте можно добавлять расценки, применять индексы, поправки, изменять лимитированные начисления, аналогично смете.


Запроцентовать можно сразу все строки элемента структуры. Для этого в графе "Всего с коэф." в строке заголовка элемента структуры нажмите на многоточие

Тит	Шт	№п/по смете	№п/по	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество	Всего с коэф.	Норма расхода	Процент выполнения	Всего	Выполнено	Остаток	Базовый уровень цен	Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭПМ	СтМаг	Прочие	НР	СП	ТрвСтр	ТрвМаш	Всего	ПЗ
				ЛС-02-01	Устройство котлована	ШТ	0			20%	10	2	8													336 514.72	336 514.72
		1	10-01-001-01	Устройство котлована	ШТ	0				20%	10	2	8													336 514.72	336 514.72
		1.1	07.2.07.13	Устройство котлована	ШТ	0				0%	0	0	0													0	0
		1.2	11.2.06.02	Устройство котлована	ШТ	0				0%	0	0	0													0	0
			ЛС-Р-01	Раздел №1																							
		1	11-01-002-06	Устройство котлована	ШТ	0				10%	5	0.5	4.5													2 539.5	2 539.5
		1.1	01.2.01.01-0001	Устройство котлована	ШТ	0				10%	0.4	0.04	0.36													26 169.13	26 169.13
		1.2	02.3.01.02-110	Устройство котлована	ШТ	0				10%	0.39	0.495	4.455													650.2	650.2
		2	13-01-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	4.95	0.495	4.455													121 629.25	121 629.25
		2.1	06.1.01.06-001	Устройство котлована	ШТ	0				10%	0.476															15 593.52	15 593.52
		3	07-01-001-01	Устройство котлована	ШТ	0				10%																3 707.34	3 707.34
		3.1	02.3.01.02-110	Устройство котлована	ШТ	0				10%	9.5															650.2	650.2
		3.2	05.1.05.04-0006	Устройство котлована	ШТ	0				10%	0	100														13 587.5	13 587.5
		4		Устройство котлована	ШТ	0				10%	0	0	0													0	0
		5	11-01-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	4	0.4	3.6													1 408.28	1 408.28
		5.1	421-11-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	2	2														0	0
		6	11-01-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	7	0.7	6.3													59 802.23	59 802.23
		6.1	421-11-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	2	2														0	0
		6.2	999-0005	Устройство котлована	ШТ	0				10%	399.7	39.97	359.73													0	0
			ЛС-Р-02	Раздел №2																							
		7	11-01-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	5	0.5	4.5													161 501.32	25 563
		7.1	421-11-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	2	2														0	0
		8	11-01-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	7	0.7	6.3													252	2 563
		9	11-01-001-09	Устройство котлована	ШТ	0				10%	7	0.7	6.3													2 475	2 475


Чтобы в выполнении учесть весь оставшийся объем работ, в контекстном меню Акта выберите пункт "Действия" - "Запроцентовать остатки"

В случае, если объем выполнения превысит проектный объем, строки в колонке "Всего с коэф" будут выделены ярко-розовым цветом


Можно установить запрет на превышение объема выполнения от проектного. Для этого в главном меню необходимо выбрать пункт меню "Настройки" - "Параметры". Перейти на вкладку "Администрирование" и установить флажок "Запрещать перепроцентаж в актах"

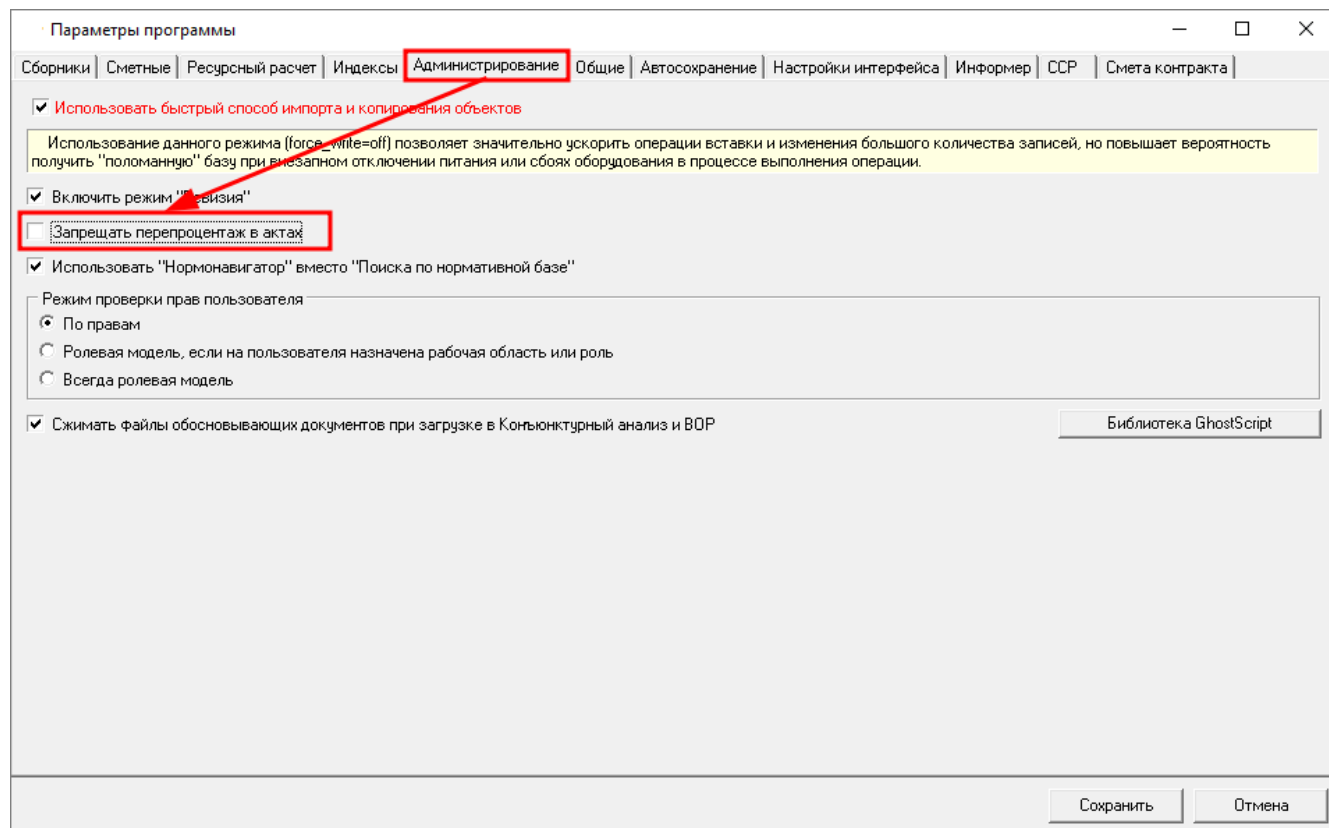


При установленном флажке "Запрещать перепроцентаж в актах", в случае превышения объема будет отображено информационное окно

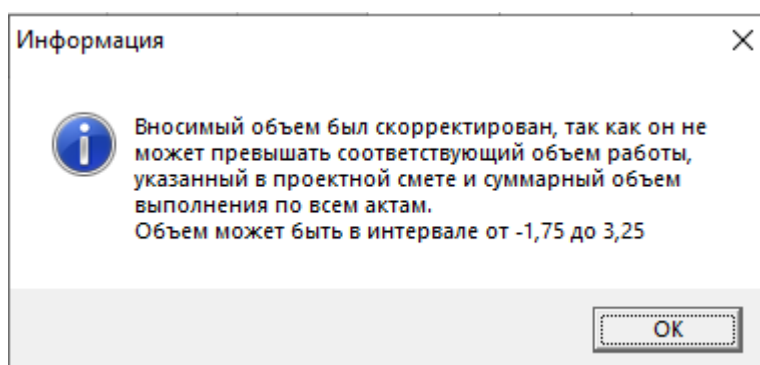


Для актов можно задавать параметры, отличающиеся от настроек сметы. Это могут быть названия организаций, подписи "Исполнил" и "Проверил", дата утверждения и др. Принципы задания параметров акта такие же, как в смете

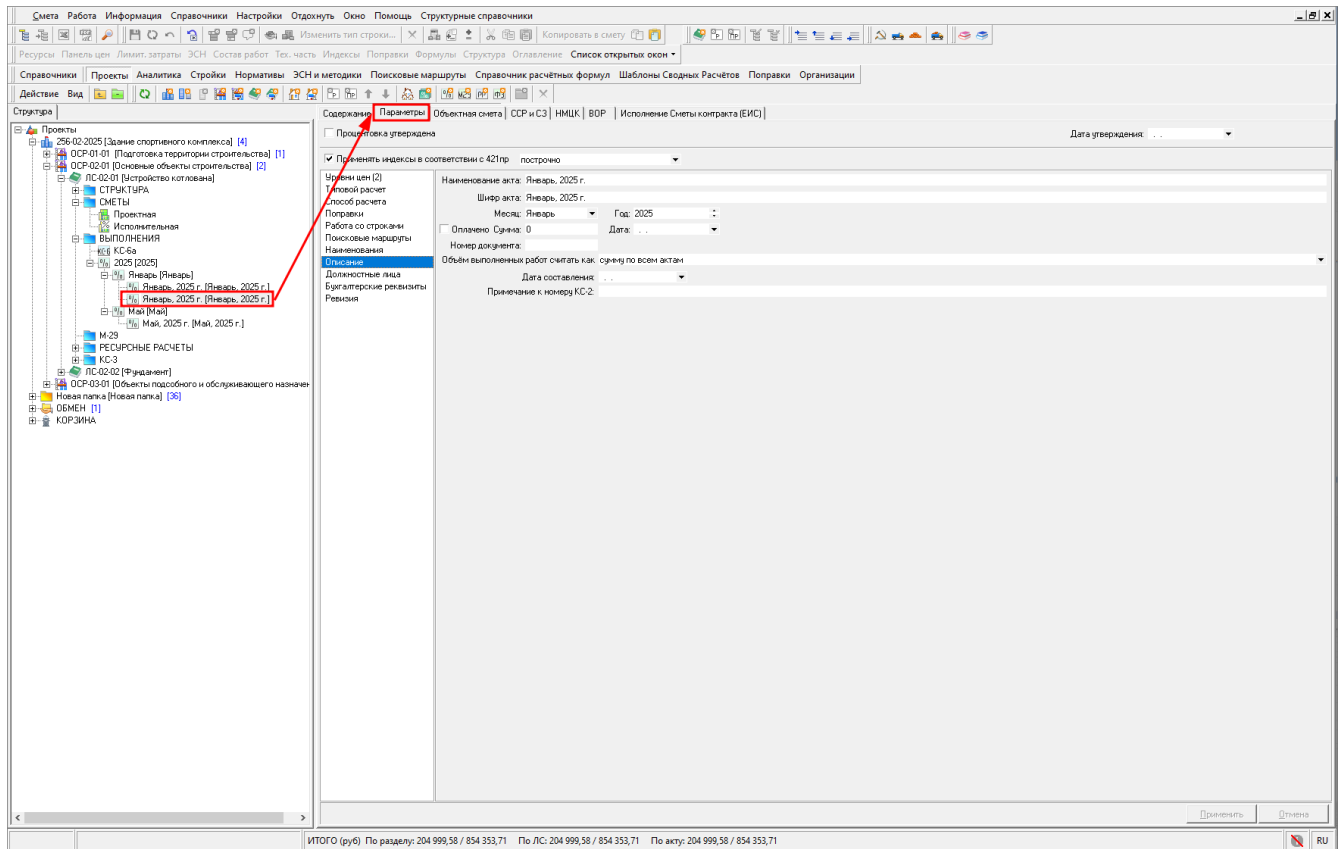

За один месяц может быть создано любое количество актов. В папке "Выполнения" справочника Проекты они автоматически группируются по годам и месяцам. Во избежание путаницы при создании нескольких актов за один месяц рекомендуется присваивать им различные имена

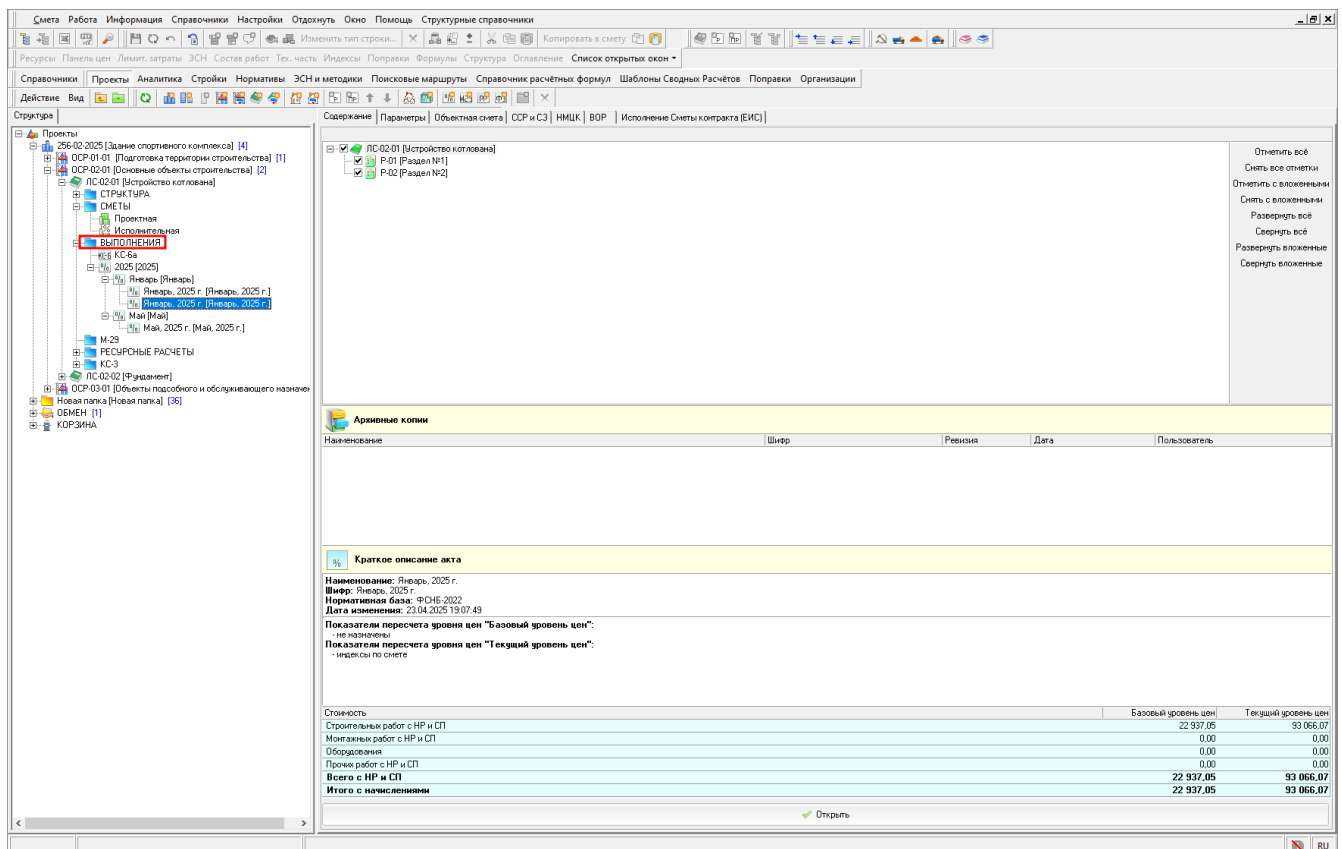

Как и в проектной смете, существует возможность утверждения актов. Для этого в параметрах акта установите флажок "Процентовка утверждена" и заполните дату утверждения

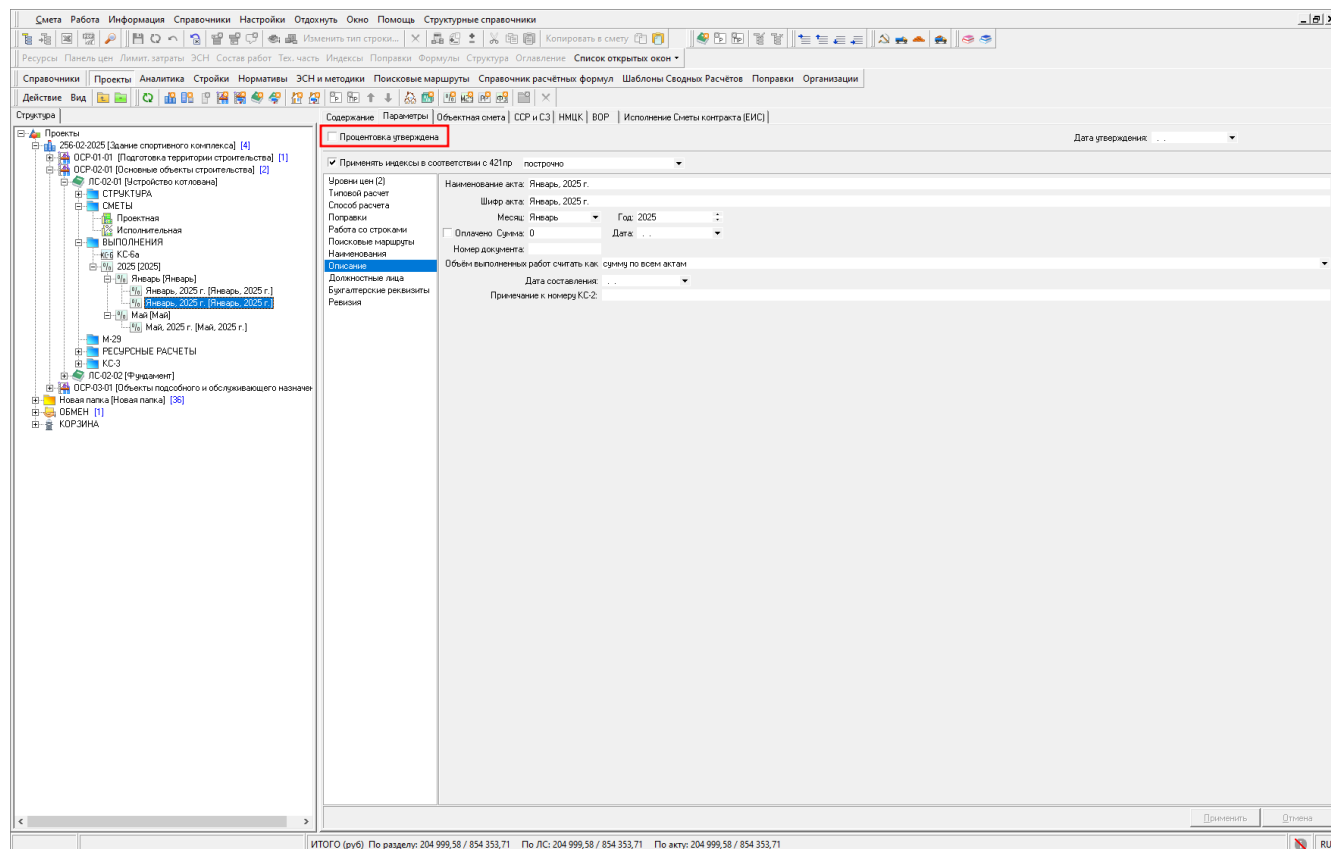

Утвержденные акты можно использовать при автоматическом заполнении объемов колонки "Выполнено". Для этого в настройках акта есть пункт "Объем выполненных работ считать как":

- сумму по всем актам (по умолчанию);
- сумму только по утвержденным актам

Смета. Работа. Информация. Справочники. Настройки. Отчеты. Окно. Помощь. Структурные справочники.																										
Ресурсы. Параметры цен. Лимит. затраты. ЭСН. Состав работ. Тех. часть. Индексы. Конъюнктурный. Поправки. Формулы. Структура. Список открытых окон. Базовый уровень цен/Текущий уровень цен.																										
Тип	Учт	№/п/о	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество	Всего с	Норма	Процент	Всего	Выполнено	Осталось	Базовый уровень цен													
							коэф.	расхода	выполнения				Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СнМар	Прочие	НР	СП	ТргаСтр	ТргаМаш	Всего	ПЗ	
	☐		ЛС1	ЛС-02-01	Устройство котлована																					
	☐	Выполнение	1	10-01-001-01	Исчерпительная сборка и установка конструкций ж/б и элементы металлические	шт	0		20%	10	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 514.72	336 514.72	
	☐		1.1	07.2.07.13	Конструкции деревянные	кг	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	☐		1.2	11.2.06.02	Конструкции деревянные	м3	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	☐		ЛС1	Р-01	Раздел №1																					
	☐	1	2	11-01-002-06	Устройство подстилающих слоев: глинобитных с битум нетканой дорожкой МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200.	м3	8		170%	5	0.5	4.5	36 699.22	8 796.82	0	2 827.72	3 392.42	2 576.68	0	3 799.51	2 205.07	0	10	2 539.5	2 539.5	
	☐	1.1	2.1	01.2.01.01-0001	Битум нетканой дорожкой МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200.	т	0.64	0.08	170%	0.4	0.04	0.36	-	16 748.24	0	0	0	16 748.24	0	0	0	0	0	26 169.13	26 169.13	
	☐	1.2	2.2	02.3.01.02-110	Песок карьерный для строительных работ I класса.	м3	7.92	0.99	170%	4.95	0.495	4.455	-	5 149.58	0	0	0	5 149.58	0	0	0	0	0	650.2	650.2	
	☐	2	3	13-01-001-09	Фигурная штукатурка	м2	7		185%	4	0.4	3.6	67 811.25	13 248.48	0	1 127.41	1 796.66	10 324.41	0	1 688.86	916.3	0	5.39	121 629.25	121 629.25	
	☐	2.1	3.1	06.1.01.06-0001	Сетка из оцинкованной проволоки	т	3.332	0.476	185%	1.904	0.1904	1.7136	-	51 957.61	0	0	0	51 957.61	0	0	0	0	0	15 593.52	15 593.52	
	☐	3	4	07-01-001-01	Укладка блоков и плит цементных фигурчатых при строительстве работ I класса.	100 шт	0.07		243.33%	0.03	0.003	0.027	100 489.11	3 546.88	0	2 785.79	761.09	0	0	837.2	555.6	0	1,7227	3 707.34	3 707.34	
	☐	3.1	4.1	02.3.01.02-110	Песок карьерный для строительных работ I класса.	м3	0.672	9.6	243.33%	0.288	0.0288	0.2592	-	436.93	0	0	0	436.93	0	0	0	0	0	650.2	650.2	
	☐	3.2	4.2	05.1.05.04-0002	Плиты железобетонные цементных фигурчатых, объем	м3	7	100	243.33%	3	0.3	2.7	-	95 112.5	0	0	0	95 112.5	0	0	0	0	0	13 587.5	13 587.5	
	☐	4	5				0		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	☐	5	6	11-01-001-09	Плата с реле с включением	шт	0		10%	4	0.4	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408.28	1 408.28	
	☐	5.1	6.1	421/пр_2020	Сметная стоимость	%	2	2	10%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	☐	6	7	11-01-002-09	Машина катковная с гусеницами	шт	0		10%	7	0.7	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 802.23	58 802.23	
	☐	6.1	7.1	421/пр_2020	Сметная стоимость	%	2	2	10%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	☐	6.2	7.2	999-0005	Масса оборудования	т	0	57.1	10%	399.7	39.97	359.73	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	☐		ЛС1	Р-02	Раздел №2																					
	☐	7	8	11-01-001-01	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	шт	0		10%	5	0.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 501.32	25 565	
	☐	7.1	8.1	421/пр_2020	Сметная стоимость	%	2	2	10%	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	☐	8	9	11-01-002-09	Вентилятор осевой с поворотными лопатками до № 8	шт	0		10%	7	0.7	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	2 563	
	☐	9	10	11-01-002-14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный	шт	0		10%	7	0.7	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475	2 475	
Полный вид Сокращенный вид Вид строки Объяснение сметы Подпросмотр																										
ИТОГО (руб) По разделу: 204 999.58 / 854 353.71 По ЛС: 204 999.58 / 854 353.71 По акту: 204 999.58 / 854 353.71																										

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать"

Доступные документы

Сметы [0 из 20]
Акты [0 из 21]
Объектные сметы [0 из 2]
Ресурсы [0 из 4]
Форма КС-3 [0 из 1]


☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.43 (11 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт по ТСН-2001 начиная с доп.67 (11 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.43 (12 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТСН-2001 начиная с доп.67 (12 граф) по двум уровням цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт СН-2012 по главам 1-5 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт СН-2012 по главе 6 (11 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 СН-2012 по главам 1-5 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 СН-2012 по главе 6 (12 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (13 граф) в ред. 557пр	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ТЕР МО 421пр индексы построчно (13 граф) в ред. 557пр	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 по ФСНБ 421пр для РИМ (13 граф) в ред. 557пр	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - построчная индексация	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт КС-2 для ТЕР МО (13 граф) - каталог текущих цен	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт для ТЕР (14 граф)	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Дефектная ведомость	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт на скрытые работы	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Акт 10 граф для РЖД	ООО "Фирма СтройСофт"

Сформировать
Отмена
Обновить
Настроить >>

Перед экспортом в Excel/PDF можно воспользоваться функцией предварительного просмотра документа. Для этого перейдите на вкладку "Предпросмотр"

Создание объединенного акта КС-2

Для объединения актов выполненных работ необходимо выбрать один из них в структуре сметы, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Создать объединенный акт..."

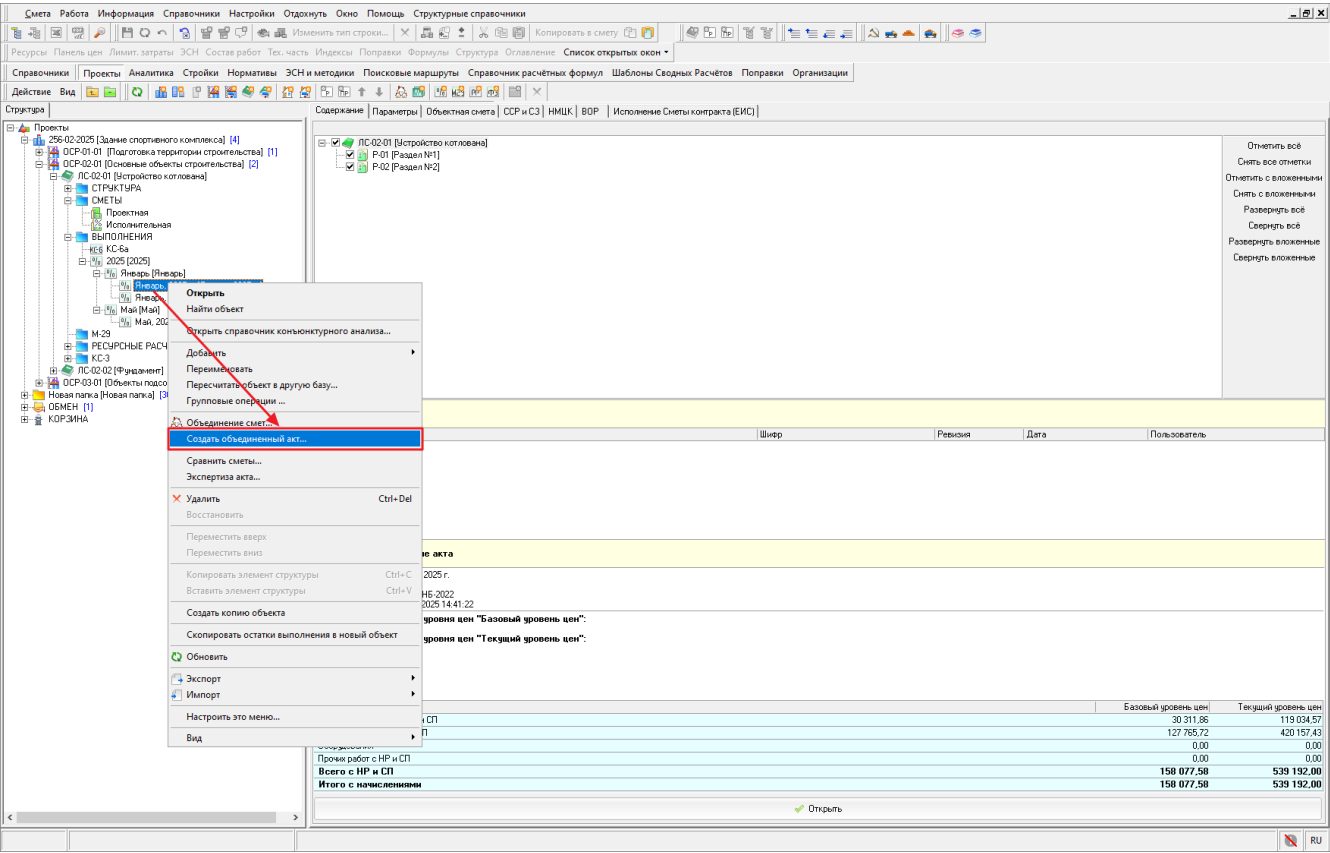

В результате откроется окно объединения актов выполненных работ, в левой части которого отобразятся все выполнения по смете

Объединение актов

Все акты

- Устройство котлована
 - 2025
 - Январь
 - Январь, 2025 г.
 - Январь, 2025 г.
 - Май
 - Май, 2025 г.

Акты для объединения

2025 год

Январь

Январь, 2025 г.

Наименование акта: Объединенный акт, Январь, 2025 г.

Шифр акта: Январь, 2025 г. Год: 2025 Месяц: Январь

Подрядчик:

Важно! Объединение актов влияет на расчет выполненного объема

Объединить Закрыть

Выбор актов для объединения производится при помощи кнопок:



- Выбрать акт для объединения;



- Убрать акт из объединения;



- Выбрать все акты для объединения;



- Убрать все акты из объединения.

Выбранные для объединения акты отобразятся в правой части окна объединения актов, а также автоматически сформируется наименование объединяемого акта, его шифр, год и месяц

Объединение актов

Все акты

Устройство котлована

2025

Январь

Январь, 2025 г.

Январь, 2025 г.

Май

Май, 2025 г.

Акты для объединения

2025 год

Январь

Январь, 2025 г.

Январь, 2025 г.

Наименование акта:

Объединенный акт, Январь, 2025 г.

Шифр акта:

Январь, 2025 г.

Год:

2025

Месяц:

Январь

Подрядчик:

Важно! Объединение актов влияет на расчет выполненного объема

Объединить

Закреть

При необходимости можно задать наименование и шифр объединенного акта, период, заполнить поле "Подрядчик" и нажать "Объединить"

Объединение актов

Все акты

Устройство котлована

2025

Январь

Январь, 2025 г.

Январь, 2025 г.

Май

Май, 2025 г.

Акты для объединения

2025 год

Январь

Январь, 2025 г.

Январь, 2025 г.

Наименование акта:

Объединенный акт, Январь, 2025 г.

Шифр акта:

Январь, 2025 г.

Год:

2025

Месяц:

Январь

Подрядчик:


ООО "Строй"

Важно! Объединение актов влияет на расчет выполненного объема

Объединить

Заккрыть


Параметры создаваемого объединенного акта наследуются из параметров проектной сметы и по своей структуре идентичны, за исключением наличия дополнительной секции "Объединенный акт". В этой секции отображается история создания, дата и время создания, а также имя пользователя, создавшего объединенный акт

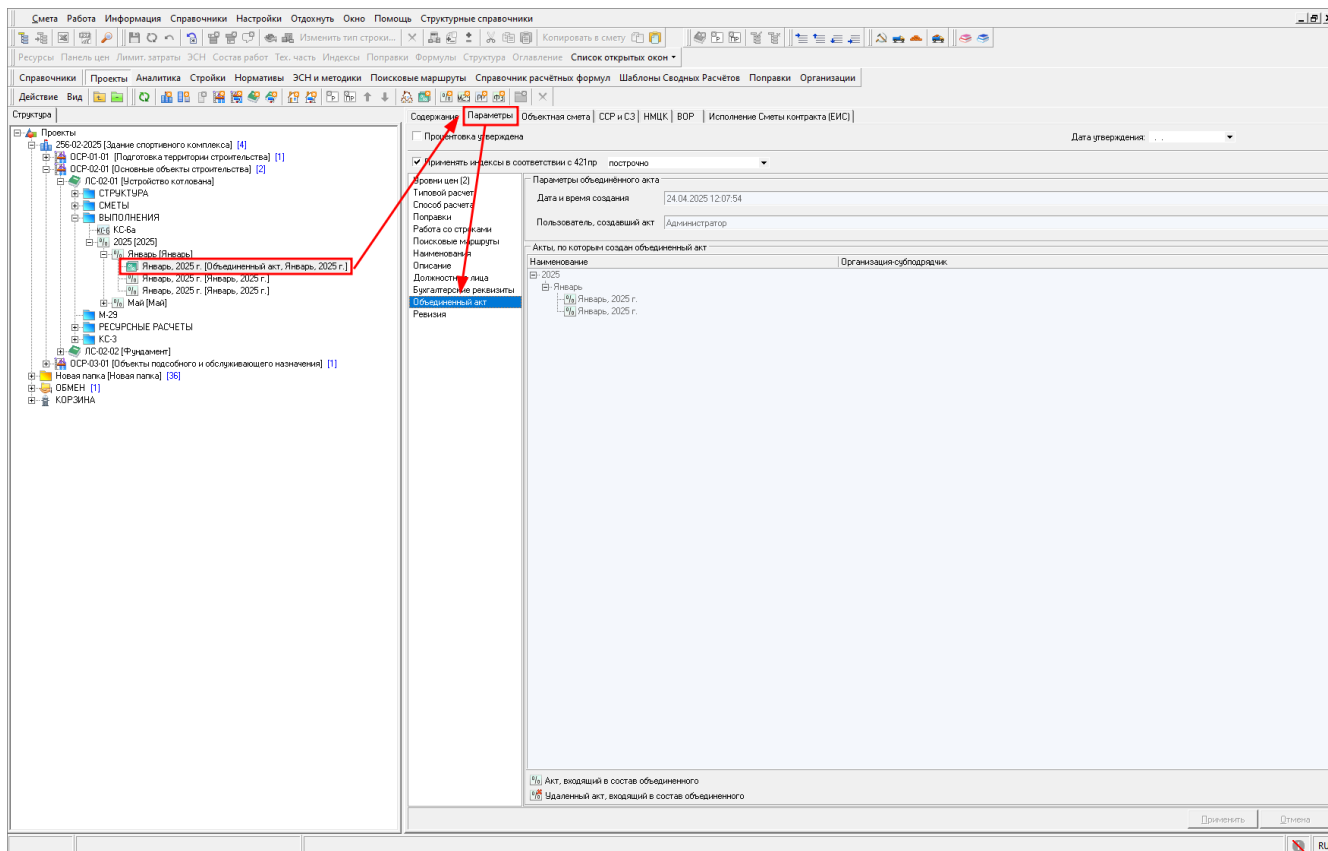


Объединенный акт всегда содержит два уровня цен (базисный и текущий) и ничем не отличается от обычных актов. Исключением является только процесс экспорта/импорта такого акта, так как после импорта акта, становится недоступной информация о том, что акт создавался объединением.

Изменение месяца и года акта КС-2

Для изменения месяца и года ранее сформированного акта КС-2 в параметрах акта выполненных работ КС-2 в секции "Описание" выберите нужный месяц и год и нажмите "Применить"

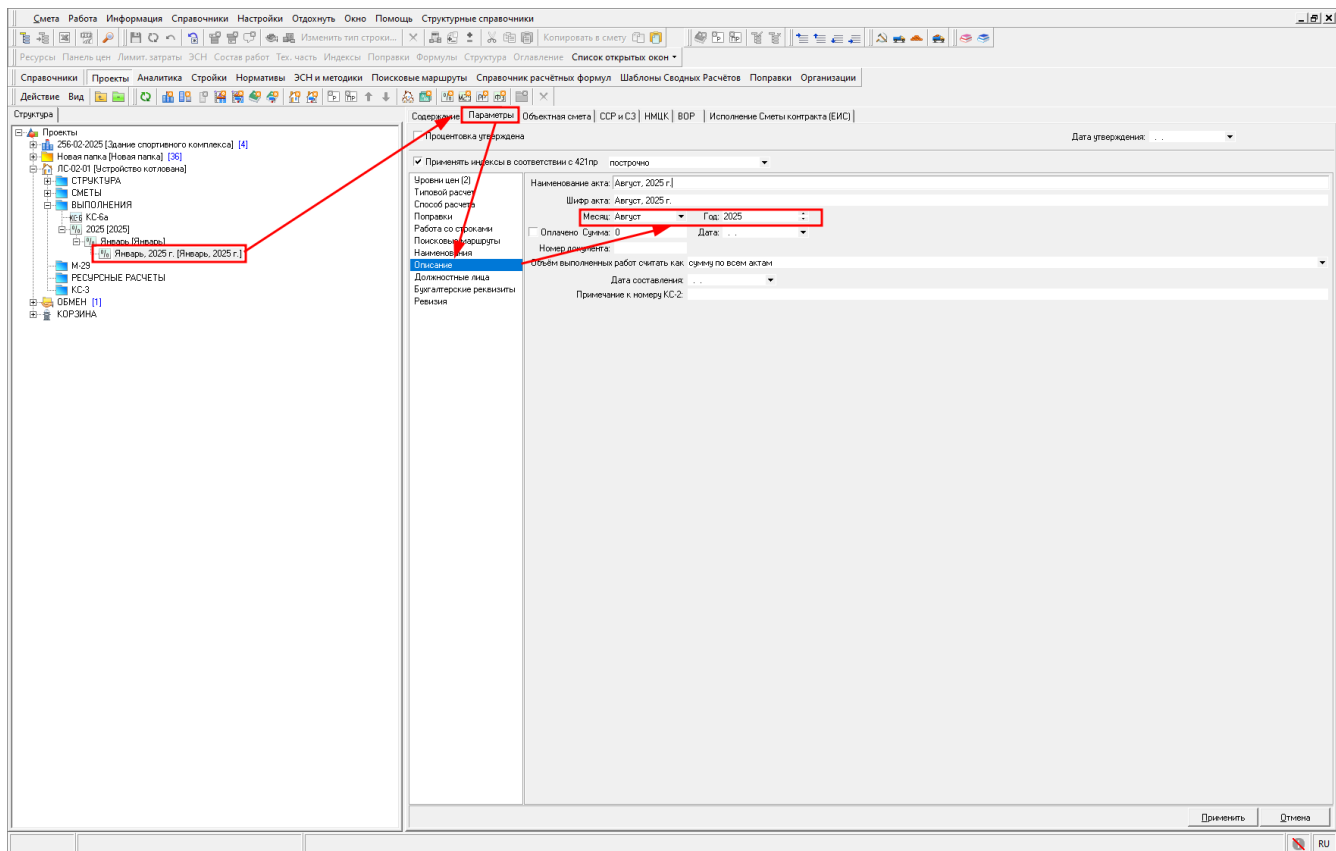

Изменение значения года или месяца приведет к перемещению акта выполненных работ по временной шкале всех актов сметы

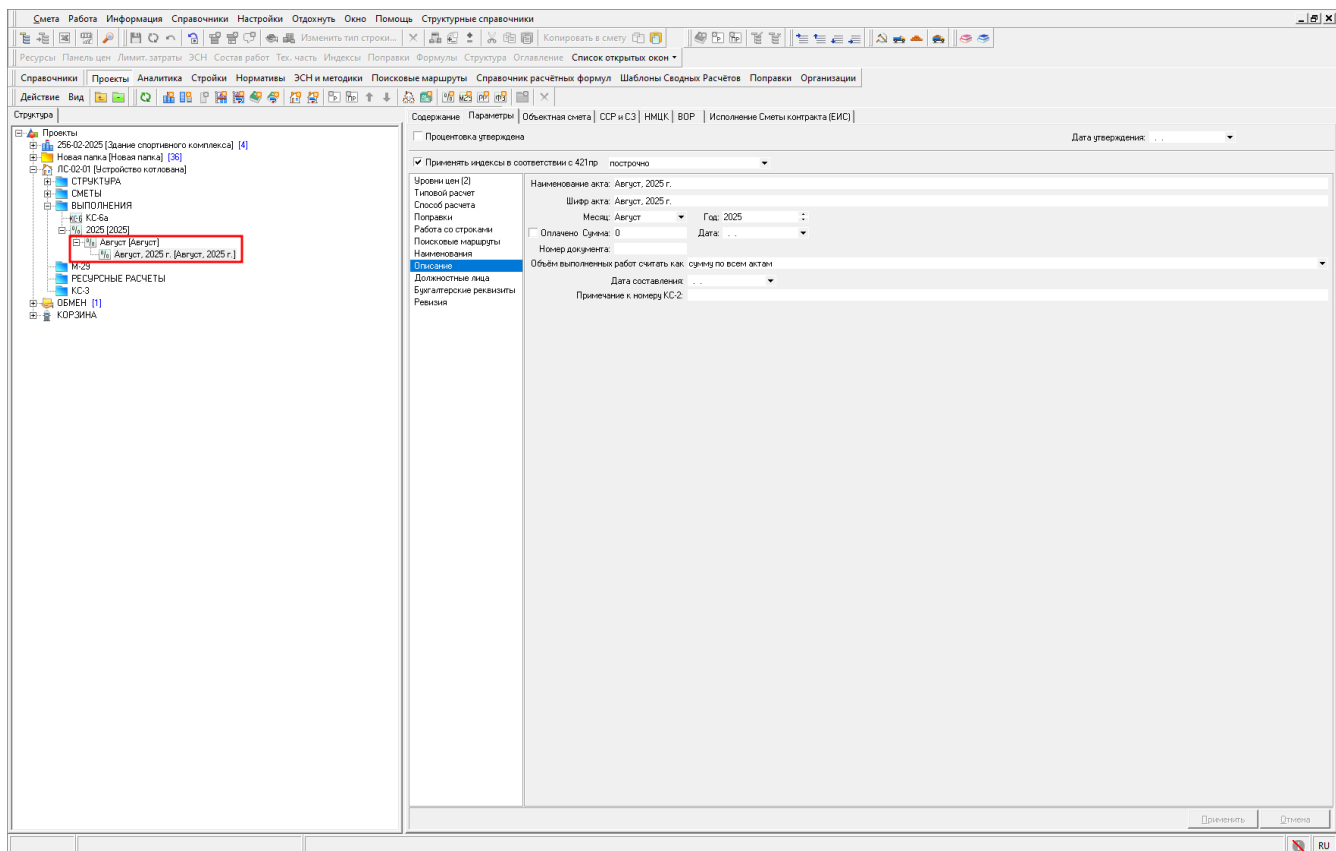

В случае, если акт перемещается ранее по временной шкале:

- Для всех дополнительных работ перемещаемого акта создаются и добавляются сметные строки и выполнения в акты, находящиеся позже на временной шкале.
- Для всех выполнений перемещаемого акта осуществляется проверка, на основании которой выполнения могут стать дополнительными работами. Как следствие, в актах, находящихся на временной шкале позже, дополнительные работы станут выполнениями.

В случае, если акт перемещается позже по временной шкале:

- Все дополнительные работы перемещаемого акта становятся выполнениями. Как следствие, все выполнения в актах, находящихся ранее на временной шкале, становятся дополнительными работами.
- В перемещаемый акт добавляются выполнения на основании имеющихся дополнительных работ в актах, находящихся ранее на временной шкале.

Примечание. По утвержденным актам выполненных работ КС-2 никаких изменений не производится.


Экспорт и импорт актов КС-2

Для обмена актами КС-2 между рабочими местами рекомендуется использовать внутренние форматы ***.sacx**.


Формат обмена сметной документацией, разработанный с применением стандарта **XML**, предназначен как для обмена данными между рабочими местами программы, так и для взаимодействия между программой и внешними системами.

Экспорт акта КС-2 во внутреннем формате

Для того, чтобы произвести экспорт акта КС-2 во внутреннем формате, выберите акт, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Экспорт" - "Акта (.sacx)"

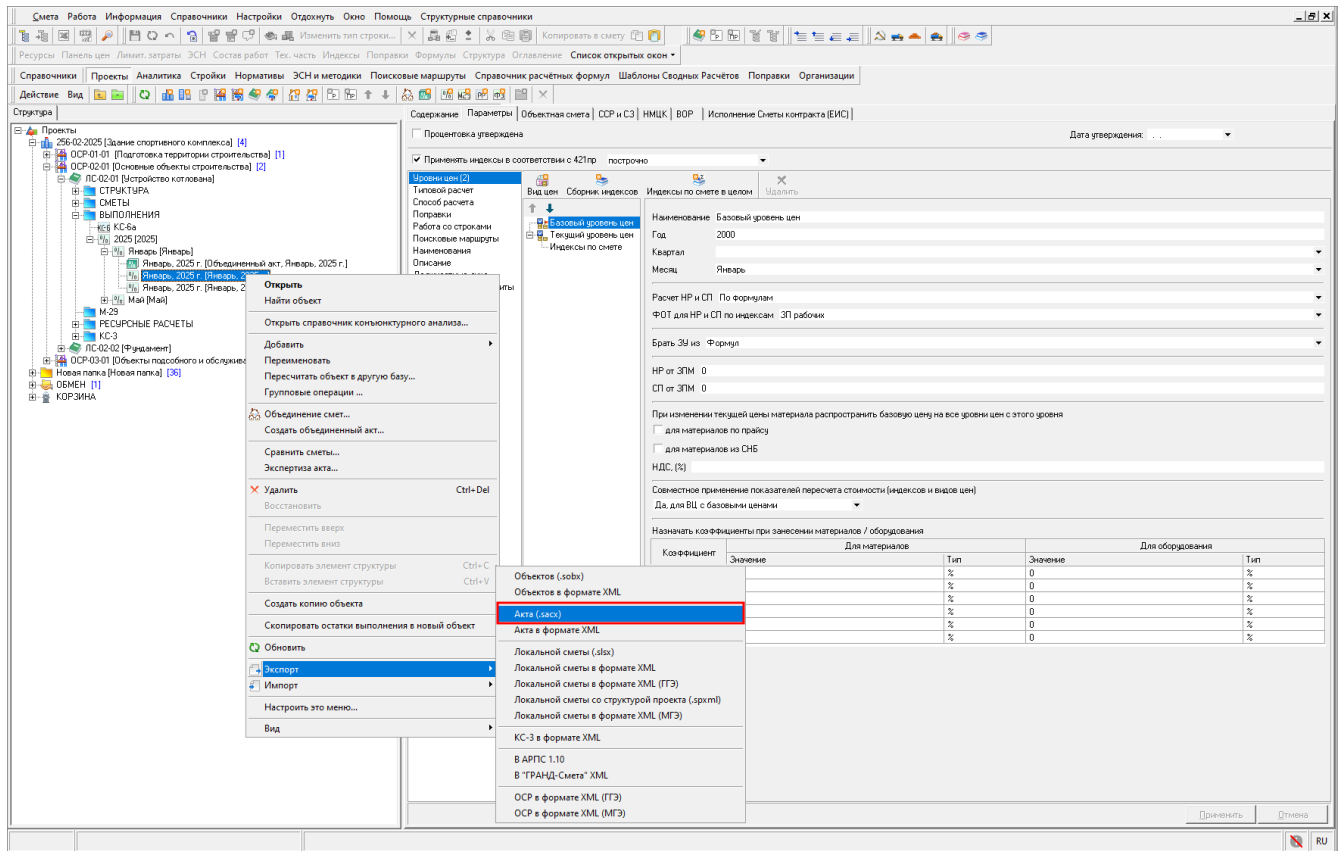


Укажите место сохранения файла и нажмите "Сохранить"

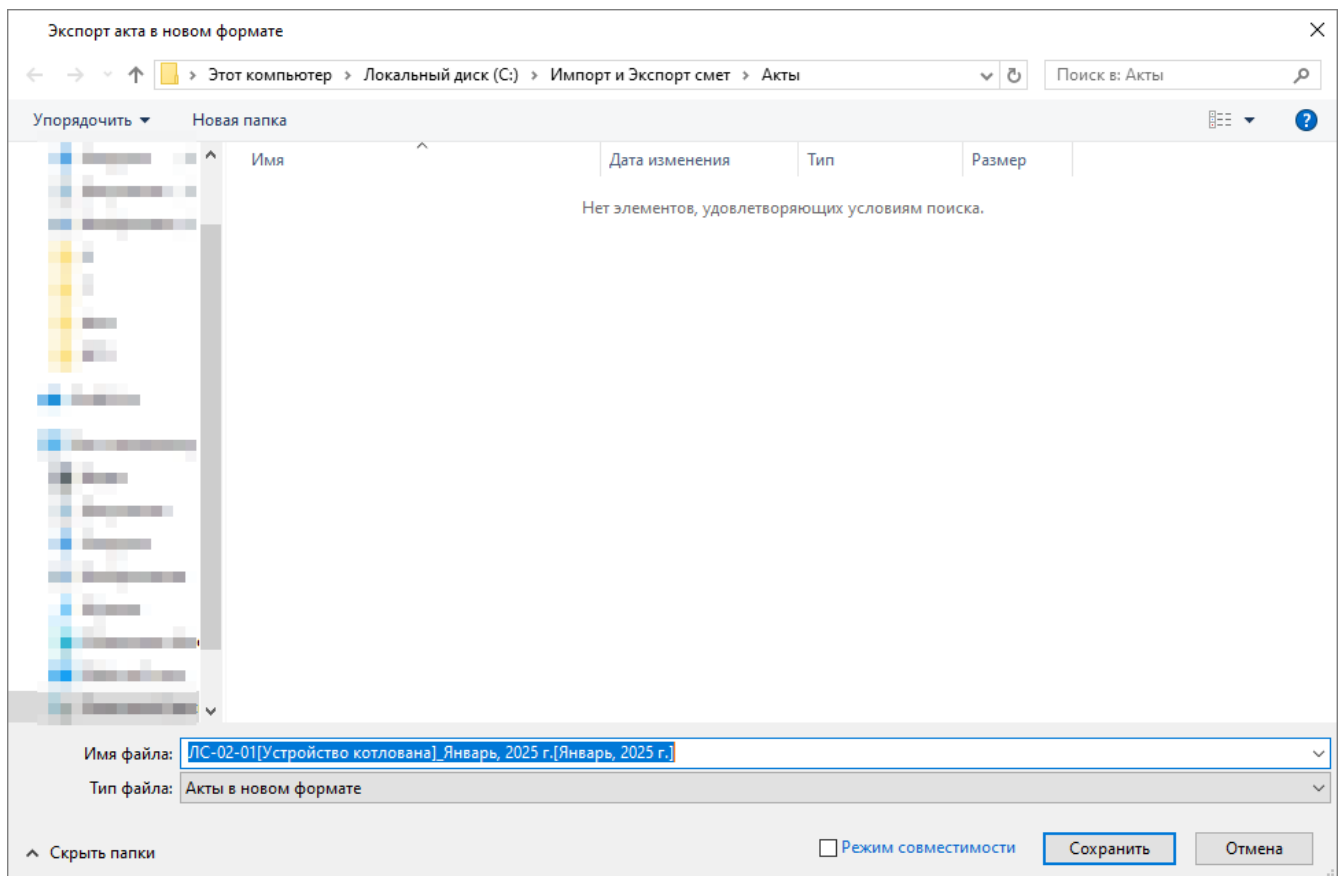


Начнется процесс экспорта, который может занять некоторое время, в зависимости от размера экспортируемого акта. По окончании процесса экспорта, акт КС-2 будет сохранен по указанному ранее пути.

Импорт акта КС-2 во внутреннем формате


Для того, чтобы произвести импорт акта КС-2 во внутреннем формате, необходимо на счете, в которую будет импортирован акт, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Импорт" - "Акта (*.sacx)"

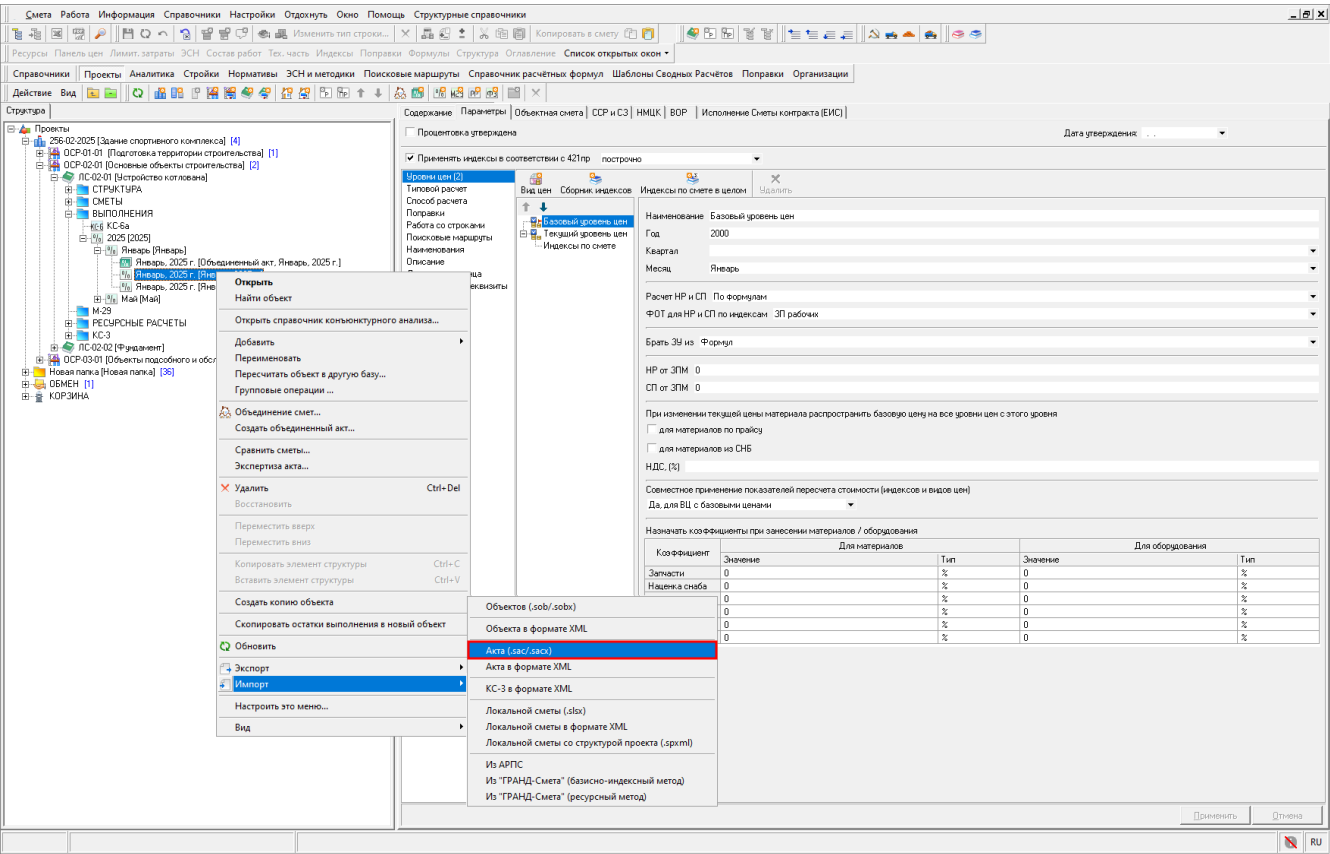


Укажите файл акта КС-2 и нажмите "Открыть"

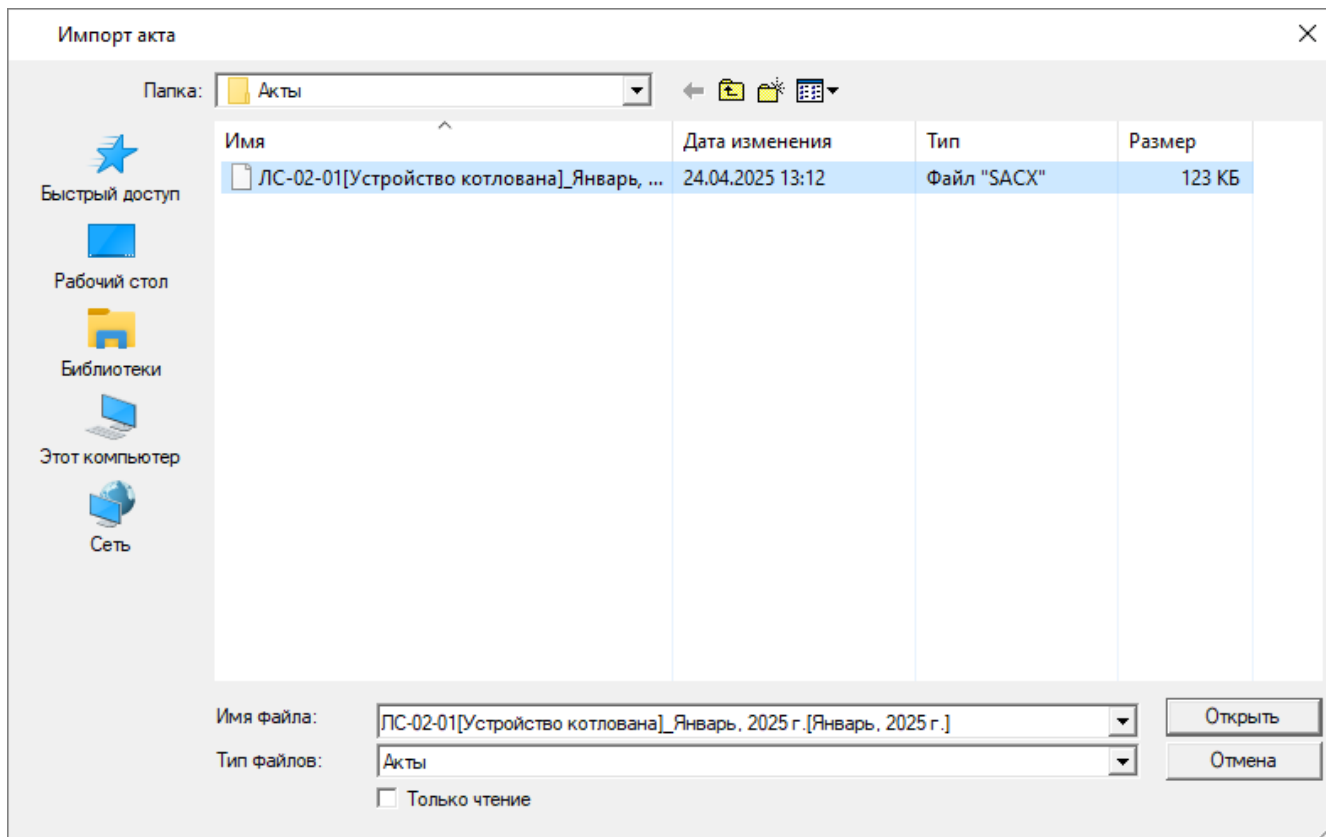

При отсутствии других актов в смете, перед началом импорта будет предложено выбрать базовый уровень цен для актов. Нажмите "Импорт"

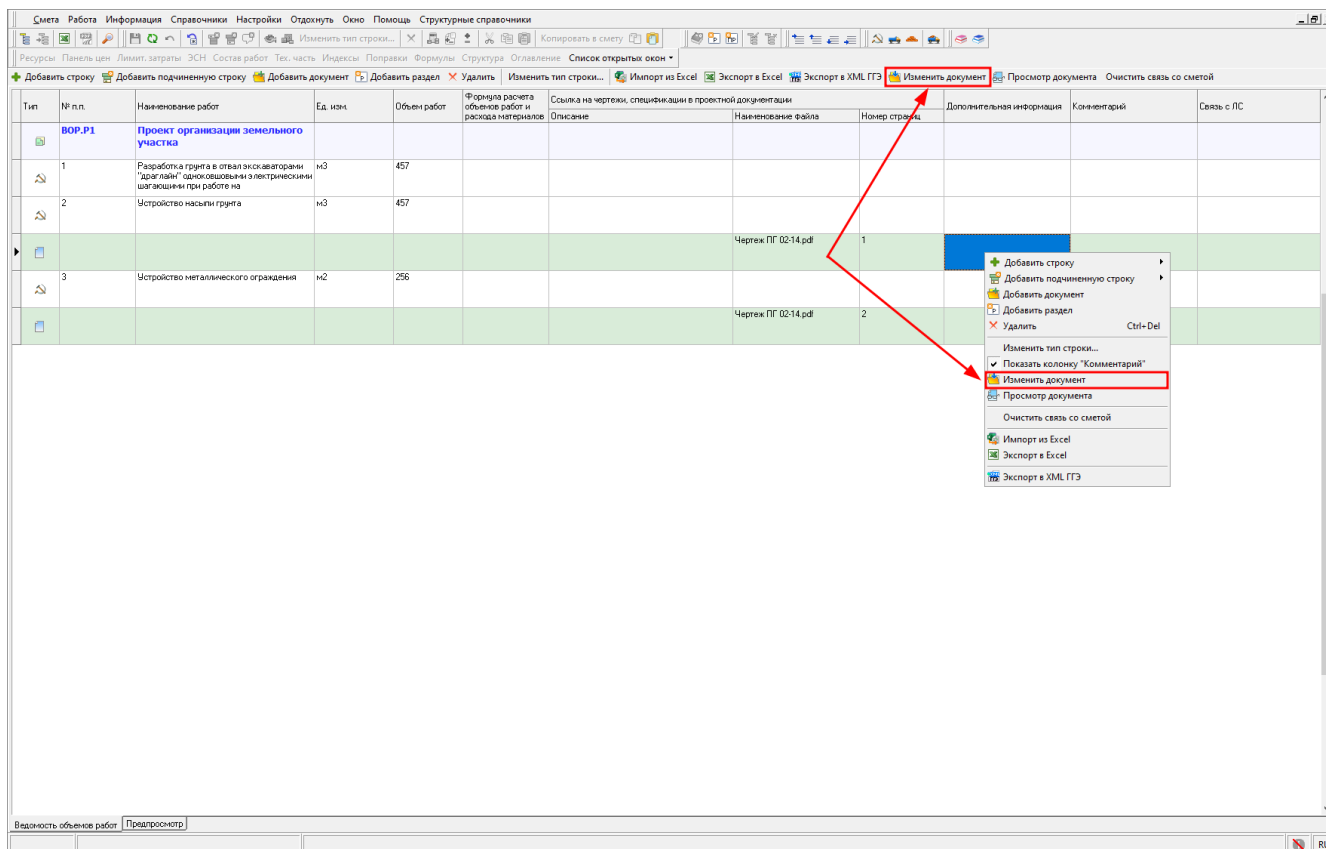


Процесс импорта может занять некоторое время, в зависимости от размера импортируемого акта. По окончании процесса импорта, в папку "ВЫПОЛНЕНИЯ" выбранной сметы будет добавлен импортированный акт КС-2

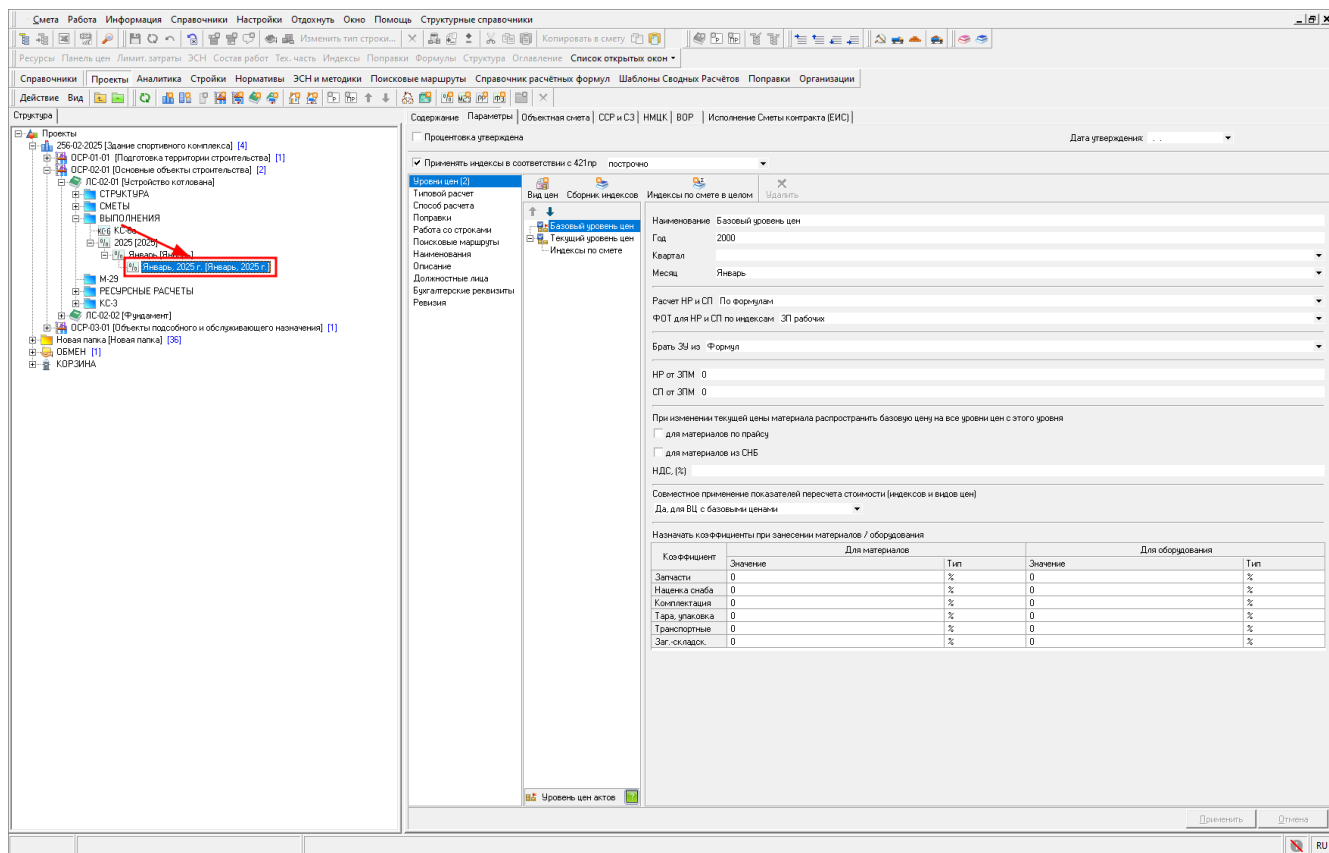


Экспорт акта КС-2 в формате XML

Для того, чтобы произвести экспорт акта КС-2 во внутреннем формате, выберите акт, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Экспорт" - "Акта в формате XML"

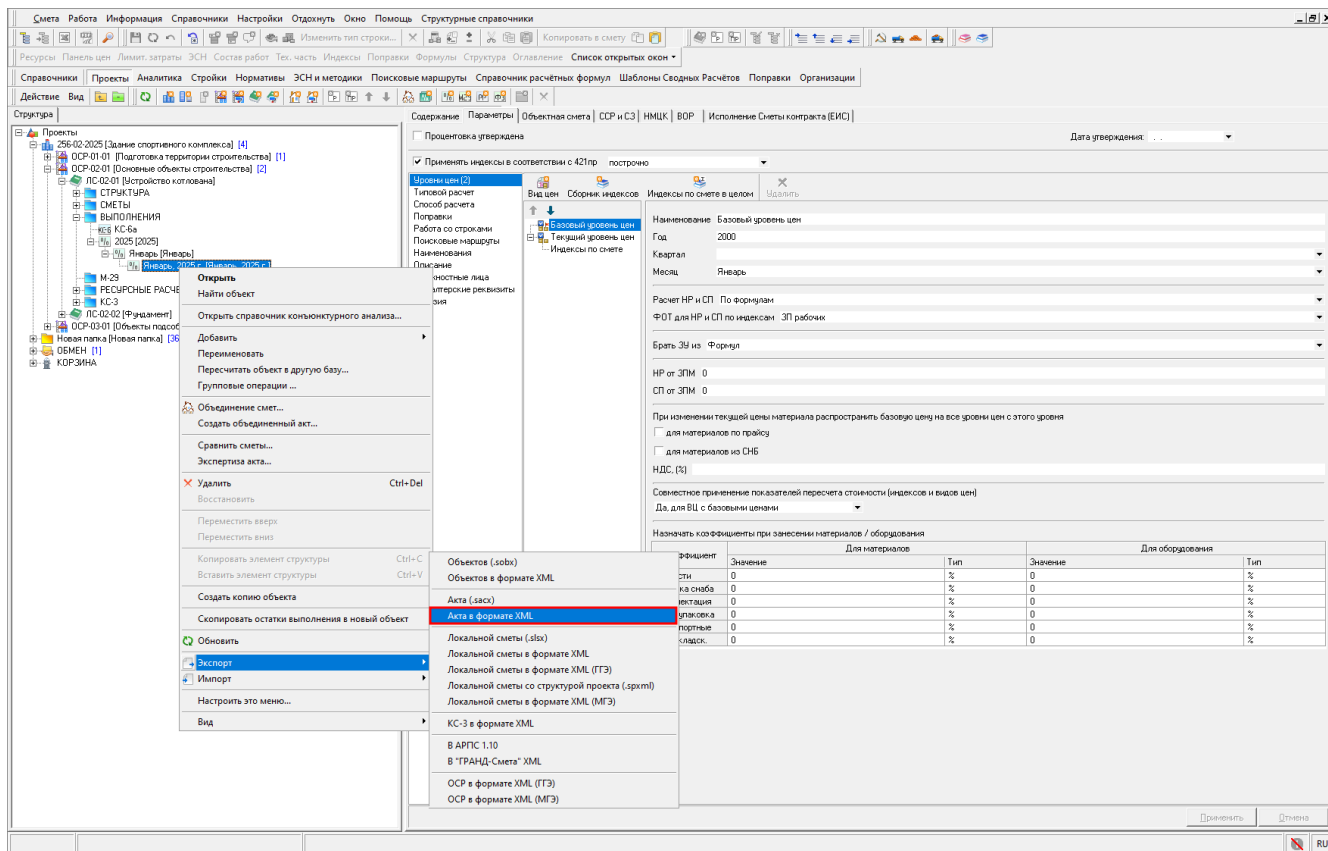


Укажите место сохранения файла и нажмите "Сохранить"

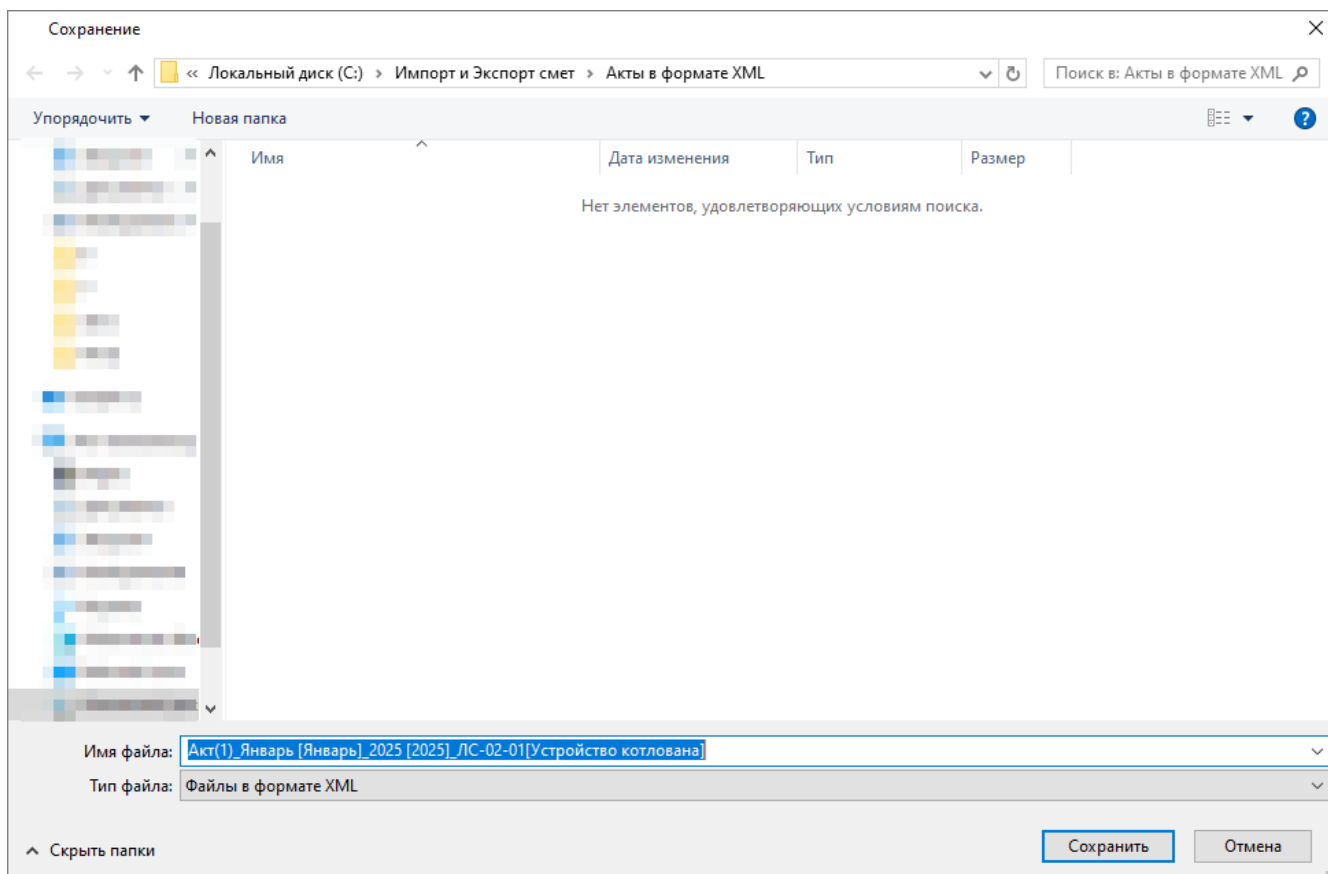


Процесс экспорта может занять некоторое время, в зависимости от размера экспортируемого акта. По окончании процесса экспорта, акт КС-2 будет сохранен по указанному ранее пути.

Импорт акта КС-2 в формате XML


Для того, чтобы произвести импорт акта КС-2 во внутреннем формате, необходимо на смете, в которую будет импортирован акт, нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Импорт" - "Акта в формате XML"

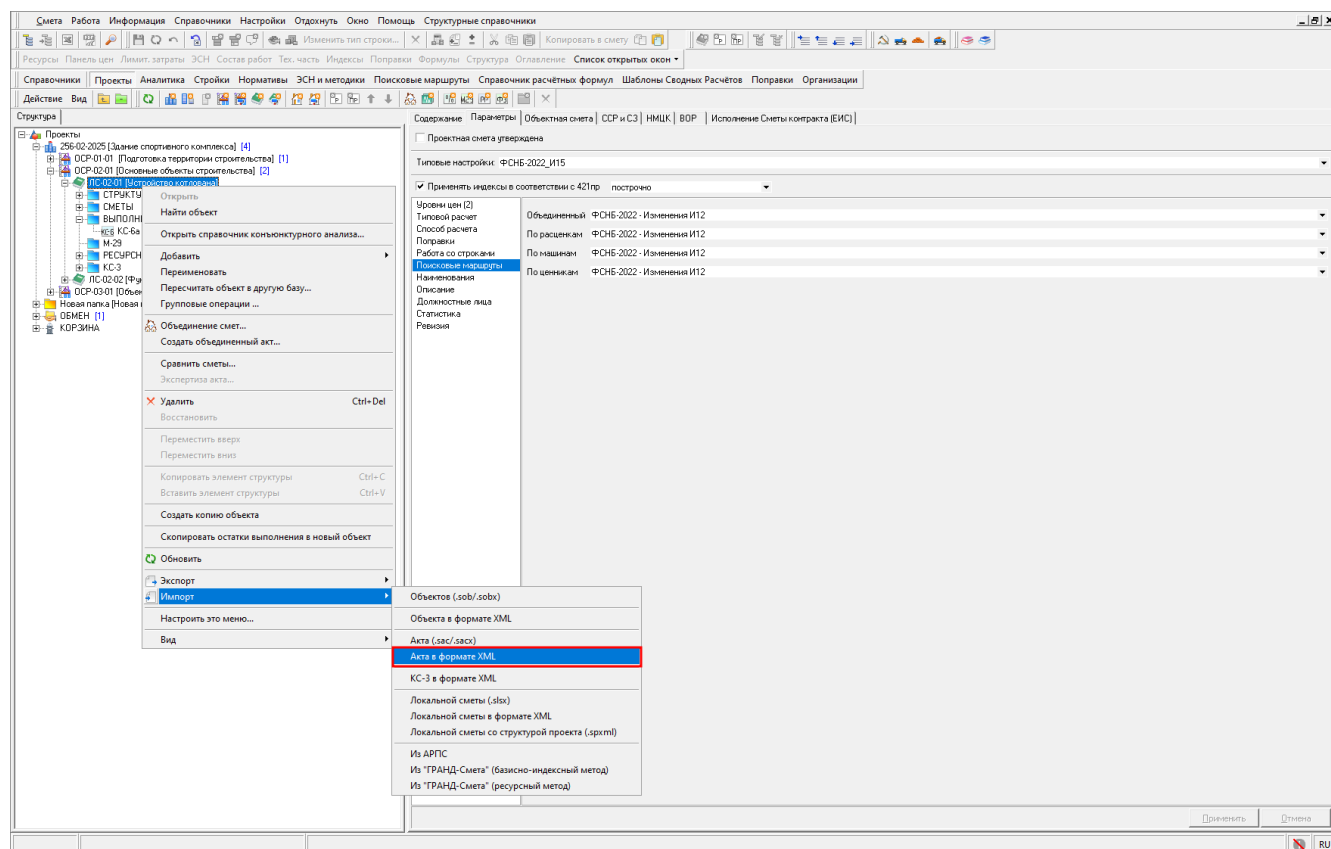

Укажите файл акта КС-2 и нажмите "Открыть"

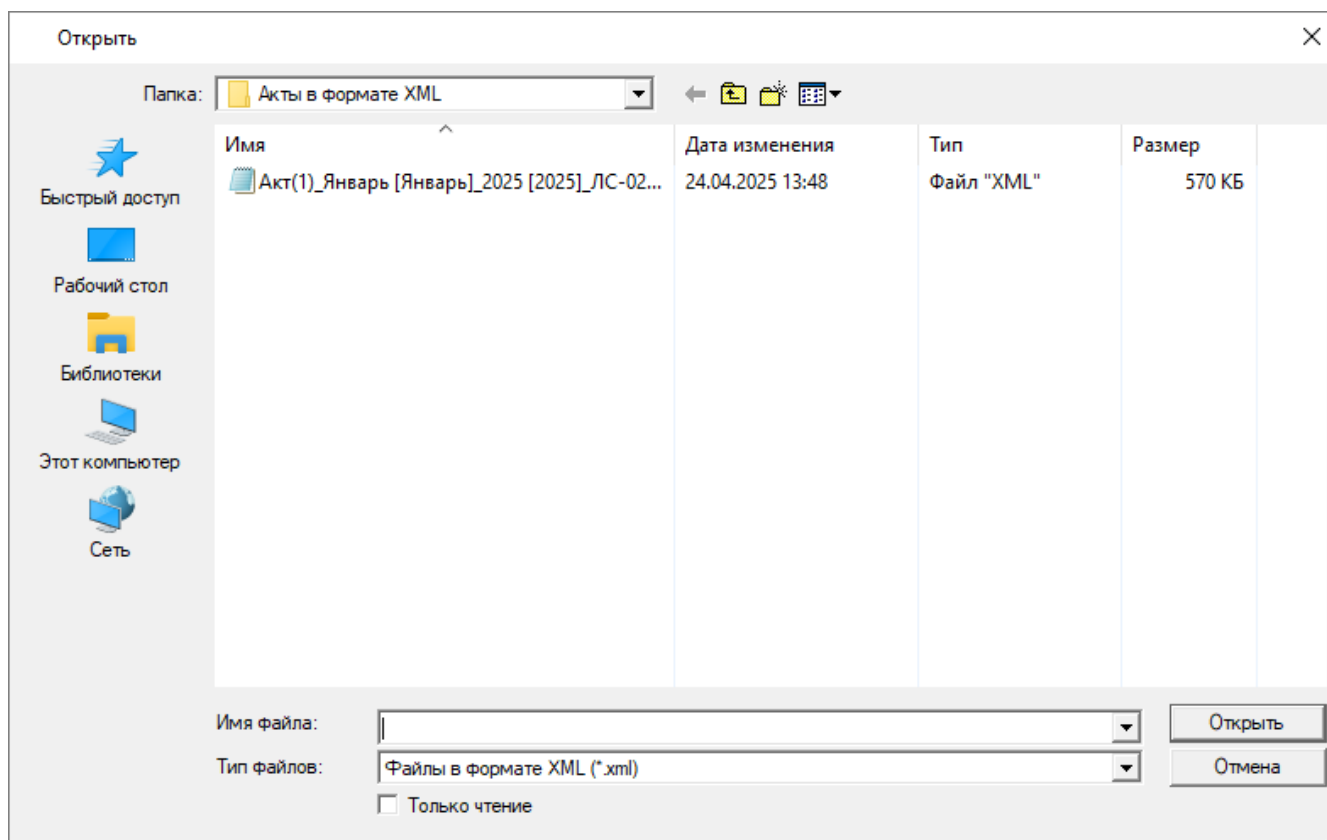

Далее будет осуществлена проверка на предмет наличия сметы, по которой был создан акт КС-2, после чего в появившемся окне "Импорт акта из XML" следует выбрать, в какую смету будет импортирован акт - в найденный (нажмите "Импорт") или в новый (нажмите "Импорт в новый объект")

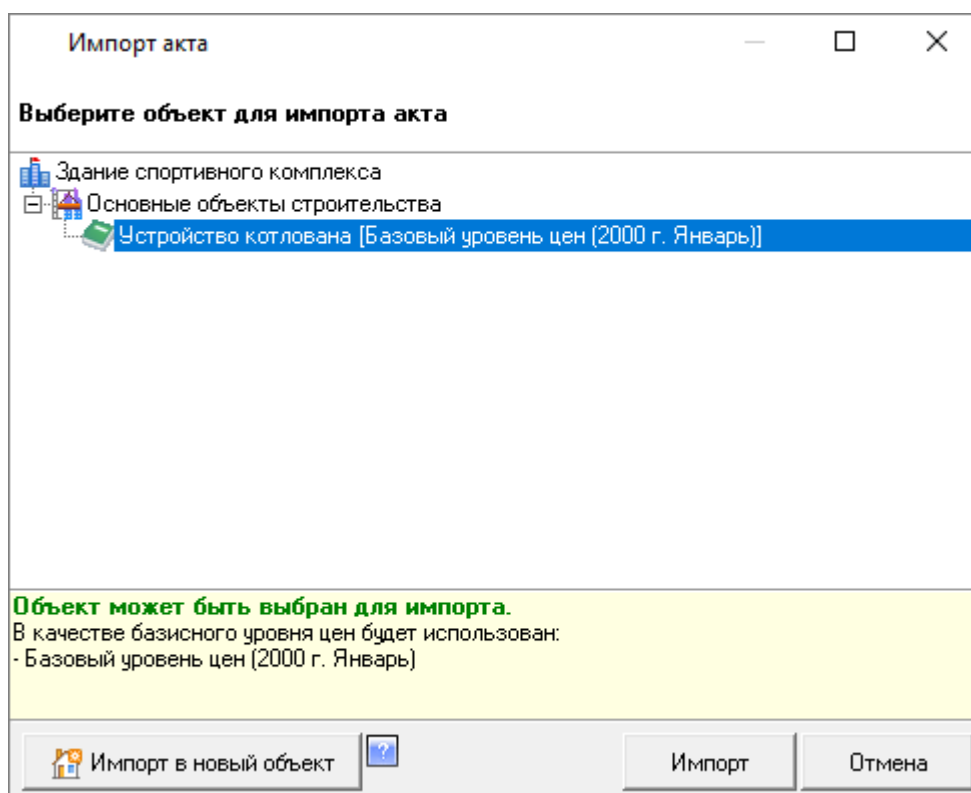


При импорте акта в найденную смету, по окончании процесса в папку "ВЫПОЛНЕНИЯ" данной сметы будет добавлен импортированный акт КС-2.

В случае импорта акта в новую смету, будет создан проект, заполнены все необходимые параметры в настройках, добавлены сметные строки, создан акт КС-2 и осуществится привязка выполнений к строкам сметы.

Журнал учета выполненных работ КС-6а


Накопительная ведомость КС-6а позволяет отслеживать процесс выполнения работ. Создание КС-6а может производиться разными способами:

- выделите нужную смету и нажмите



;

- в смете раскройте папку "Выполнения" и дважды щелкните левой кнопкой мыши по пункту "КС-6а";
- выделите смету и на клавиатуре нажмите сочетание клавиш <Ctrl+4>

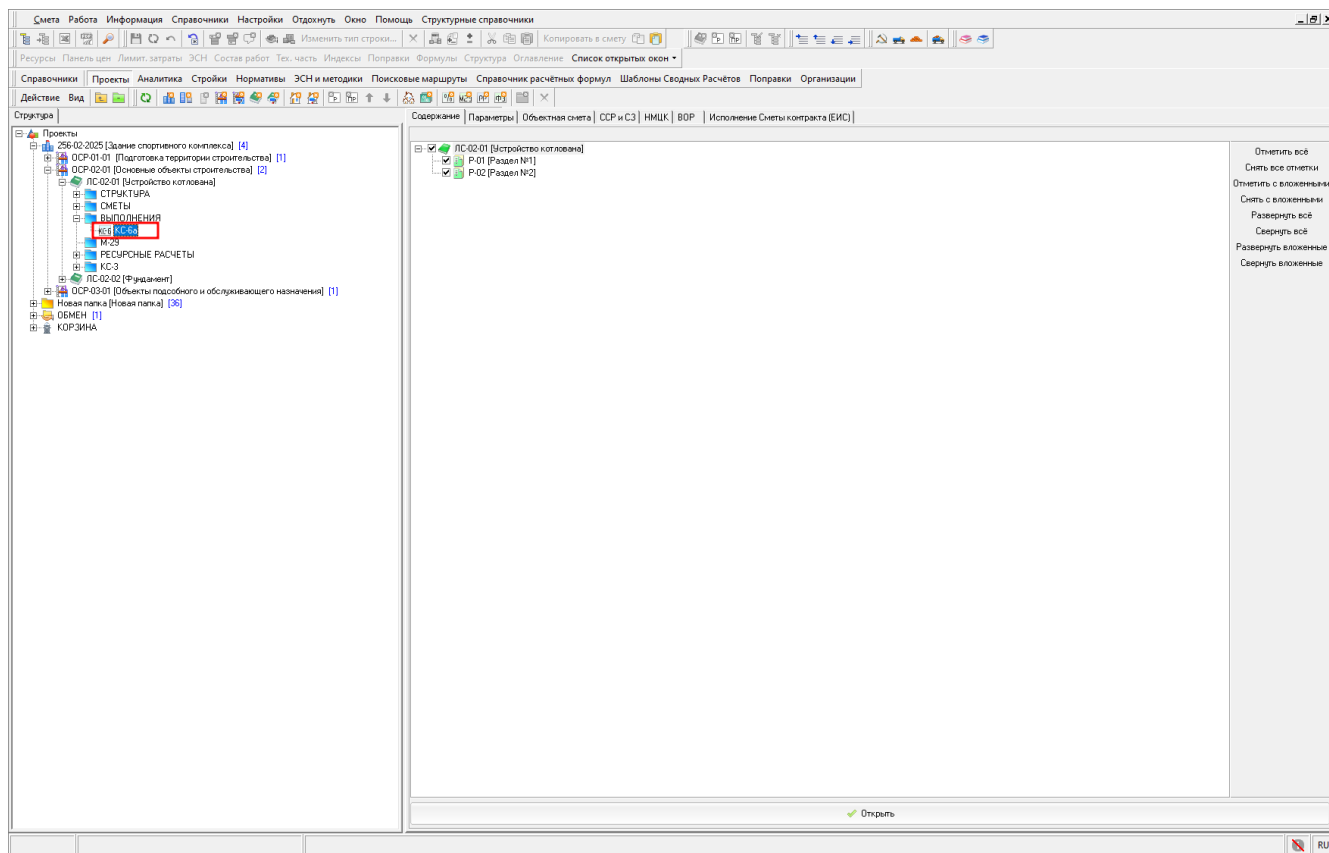

В появившемся диалоговом окне укажите параметры ведомости: отчетный период и уровень цен, как формировать стоимость и по каким актам будет рассчитана ведомость. Для формирования КС-6а за один год необходимо ввести одинаковые значения начала и окончания периода. Нажмите "Далее"

Параметры КС-ба

Введите период: 2025 — 2025

Уровень цен проектной сметы (для расчета сметной стоимости)

Базовый уровень цен

Выберите уровень цен актов для формирования КС-6

☒ Базисный (Базовый уровень цен)

☐ Текущий

Стоимость формировать как:

☒ Всего

☐ ПЗ

Формировать КС-6:

☒ Только по обычным актам

☐ Только по объединенным актам

☐ По объединенным и по обычным актам, не входящим в состав объединенных

< Назад Далее > Создать Закрыть


Отметьте нужные акты (по умолчанию выбраны все) и нажмите "Создать"

Параметры КС-ба

	Тип	Месяц	Наименование
☒	0/0	Июнь	Июнь, 2025 г.
☒	0/0	Июль	Июль, 2025 г.

< Назад Далее > Создать Закрыть

После этого будет сформирован журнал учета выполненных работ, объединяющий все акты за указанный период. Он представлен в виде таблицы, содержащей все строки проектной сметы и актов

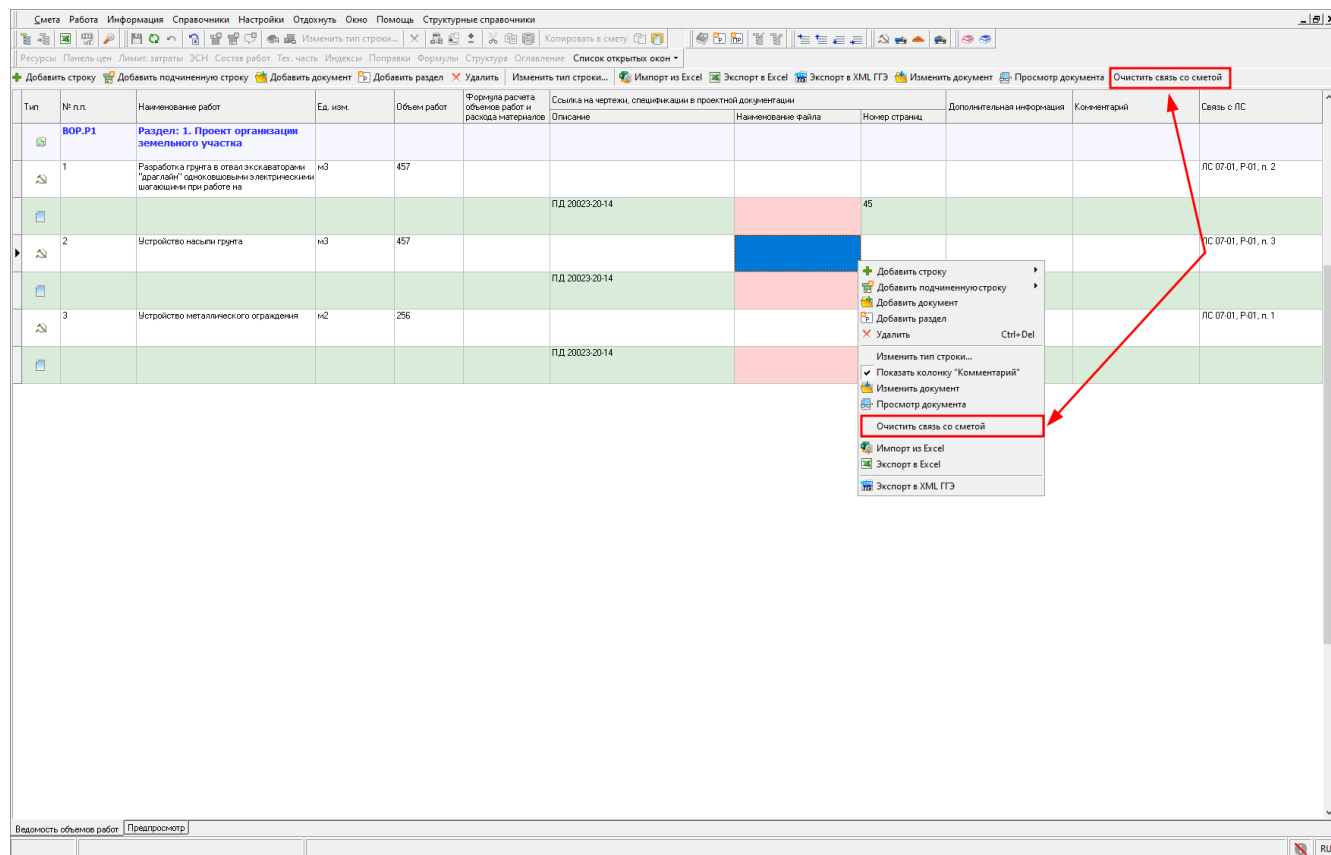

Тип	№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формулы расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертеж, спецификацию в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц	Дополнительная информация	Комментарий	Связь с ЛС
		ВОР.Р1 Раздел: 1. Проект организации земельного участка									
	1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" с одноковшовыми электрическими шаговыми при работе на	м3	457							ЛС 07-01, Р-01, п. 2
						ПД 20023-20-14		45			
	2	Устройство насыпи грунта	м3	457							ЛС 07-01, Р-01, п. 3
						ПД 20023-20-14					
	3	Устройство металлического ограждения	м2	256							ЛС 07-01, Р-01, п. 1
						ПД 20023-20-14					

В журнале доступно окно структуры для скрытия/раскрытия элементов структуры, а так же их исключения из расчета. Для отображения окна структуры нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Структура"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

№ п/п по смете	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Объем	Стоимость (Базовая, уровень цен)	Вып. с начала стр-ва		За 2025 г.		Итого за год		Остаток		
						объем	стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	объем	стоимость	
Устройство котлована														
Раздел №1														
1	11-01-002-06	Устройство подстилающих слоев	м3	5	9 250,91	0	1,25	2 212,71	0,5	925,06	1,75	3237,77	3,25	6 013,14
1.1	01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70	т	0,4	10 467,65	0	0,1	2 616,91	0,04	1 046,77	0,14	3663,68	0,26	6 803,97
1.2	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных	м3	4,95	3 218,49	0	1,2375	804,62	0,495	321,85	1,7325	1126,47	3,2175	2 092,02
2	13-01-001-09	Фигурная штукатурка	м2	4	9 059,23	0	1	2 264,8	0,4	905,93	1,4	3170,73	2,6	5 888,5
2.1	06.1.01.06-0011	Кирпич кислотоупорный прямой КЛ	т	1,904	29 690,06	0	0,476	7 422,52	0,1904	2 968,01	0,6664	10391,53	1,2376	19 298,53
3	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных	100 шт	0,03	2 116,99	0	0,0075	529,23	0,003	211,71	0,0105	740,94	0,0195	1 376,06
3.1	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных	м3	0,288	187,26	0	0,072	46,81	0,0288	18,73	0,1008	65,54	0,1872	121,72
3.2	05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточных	м3	3	40 762,5	0	0,75	10 190,63	0,3	4 076,25	1,05	14266,88	1,95	26 495,62
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	м10-01-001-09	Плата с реле с включением	шт	4	185,66	0	1	46,42	0,4	18,56	1,4	64,98	2,6	120,68
5.1	421/пр_2020_л.75_г	Сметная стоимость вспомогательных:	%	8	0	0	2	0	0,8	0	2,8	0	5,2	0
6	м23-01-002-09	Машина гребильная сигарного типа	шт	7	1 235 750,51	0	1,75	308 937,63	0,7	123 575,01	2,45	432512,67	4,95	803 237,84
6.1	421/пр_2020_л.75_г	Сметная стоимость вспомогательных:	%	14	0	0	3,5	0	1,4	0	4,9	0	9,1	0
6.2	999-0005	Масса оборудования	т	399,7	0	0	99,925	0	39,97	0	139,895	0	259,805	0
Раздел №2														
7	м08-01-001-01	Трансформатор трехфазный 35 кВ	шт	5	41 721,4	0	1,25	10 430,33	0,5	4 172,12	1,75	14602,45	3,25	27 118,95
7.1	421/пр_2020_л.75_г	Сметная стоимость вспомогательных:	%	10	0	0	2,5	0	1	0	3,5	0	6,5	0
8	м03-01-002-09	Вентилятор осевой с поворотными	шт	7	0	0	1,75	0	0,7	0	2,45	0	4,95	0
9	м03-01-002-14	Вентилятор радиальный	шт	7	0	0	1,75	0	0,7	0	2,45	0	4,95	0
Итого					1 382 410,66	0		345 602,61		138 241,03		483 843,64		898 567,02

Полное наименование

☒ Показывать итоги

☒ Структура

Элемент структуры

1 П.02-01 (Устройство котлована)

1.1 П.01 (Раздел №1)

1.2 П.02 (Раздел №2)

Развернуть

Распечатать

Табличный вид

Предпросмотр

Принять

Элемент структуры

Развернуть

Распечатать

1.1 П-01 [Устройство котлована]

1.2 П-02 [Раздел №2]

Применить

RU

Журнал доступен только для просмотра, изменение данных может производиться только через корректировку соответствующих актов.

Журнал учета выполненных работ не сохраняется. Он формируется на основе существующих данных каждый раз при создании.

Для отображения/скрытия итогов нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Показать итоги"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

И

В

П

Д

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

Для отображения полного наименования строк нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Полное наименование"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

№ п/п по смете	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Объем	Стоимость (Базовый уровень цен)	Вып. с начала стро-ва		За 2025 г.		Итого за год		Остаток		
						объем	стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	объем	стоимость	
Устройство котлована														
Раздел №1														
1	11-01-002-06	Устройство подстилающие слое:	м3	5	9 250.91	0	1.25	2 312.71	0.5	925.06	1.75	3237.77	3.25	6 013.14
1.1	01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70,	т	0.4	10 467.65	0	0.1	2 616.91	0.04	1 046.77	0.14	3663.68	0.26	6 803.97
1.2	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных	м3	4.95	3 218.49	0	1.2375	804.62	0.495	321.85	1.7325	1126.47	3.2175	2 092.02
2	13-01-001-09	Фигуровка шпательми	м2	4	9 059.23	0	1	2 264.8	0.4	905.93	1.4	3170.73	2.6	5 888.5
2.1	06.1.01.06-0011	Кирпич кислотоупорный правый КЛ,	т	1.904	29 690.06	0	0.476	7 422.52	0.1904	2 969.01	0.6664	10391.53	1.2376	19 298.53
3	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточек	100 шт	0.03	2 116.99	0	0.0075	529.23	0.003	211.71	0.0105	740.94	0.0195	1 376.05
3.1	02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных	м3	0.288	187.26	0	0.072	46.81	0.0288	18.73	0.1008	65.54	0.1872	121.72
3.2	05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточных	м3	3	40 762.5	0	0.75	10 190.63	0.3	4 076.25	1.05	14266.88	1.95	26 495.62
4			т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	м10-01-001-09	Плата с реле с включением	шт	4	185.66	0	1	46.42	0.4	18.56	1.4	64.98	2.6	120.68
5.1	421/пр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомогательн	%	8	0	0	2	0	0.8	0	2.8	0	5.2	0
6	м23-01-002-09	Машина крпильная сигарного т	шт	7	1 235 750.51	0	1.75	308 937.63	0.7	123 575.04	2.45	432512.67	4.55	803 237.84
6.1	421/пр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомога	%	14	0	0	3.5	0	1.4	0	4.9	0	9.1	0
6.2	999-0005	Масса оборудования	т	399.7	0	0	99.325	0	39.97	0	139.895	0	259.805	0
Раздел №2														
7	м08-01-001-01	Трансформатор трехфазный, 35 кВ	шт	5	41 721.4	0	1.25	10 430.33	0.5	4 172.12	1.75	14602.45	3.25	27 118.95
7.1	421/пр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомога	%	10	0	0	2.5	0	1	0	3.5	0	6.5	0
8	м03-01-002-09	Вентилятор осевой с поворот	шт	7	0	0	1.75	0	0.7	0	2.45	0	4.55	0
9	м03-01-002-14	Вентилятор радиальный	шт	7	0	0	1.75	0	0.7	0	2.45	0	4.55	0
Итого					1 382 410.66	0		345 602.61		138 241.03		483 843.64		898 567.02

Табличный вид

Предпросмотр

20. Полное наименование

Плата с реле с включением различных свободнозагрелечных

Экспорт в Excel/PDF

Для экспорта журнала КС-6 в Excel или PDF необходимо нажать на панели инструментов соответствующий значок, выбрать место для сохранения файла и нажать "Сохранить"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники														
Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отделение Список открытых окон														
№ п/п по смете	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Объем	Стоимость (Базовый уровень цен)	Вып. с начала строфа		За 2025 г.		Итого за год		Остаток		
						объем	стоимость	Итого, 2025 г.	Итого, 2025 г.	Объем	Стоимость	Объем	стоимость	
Устройство котлована														
Раздел №1														
1	11-01-002-06	Устройство подстилающих слоев:	м3	5	9 250.91	0	1.25	2 312.71	0.5	925.06	1.75	3237.77	3.25	6 013.14
1.1	01-2-01-01-0001	Битум нефтяной дорожный МП 40/70,	т	0.4	10 467.65	0	0.1	2 616.91	0.04	1 046.77	0.14	3663.68	0.26	6 803.97
1.2	02-3-01-02-1102	Песок природный для строительных	м3	4.95	3 218.49	0	1.2375	804.62	0.495	321.85	1.7325	1126.47	3.2175	2 092.02
2	13-01-001-09	Фигурная штукатурка	м2	4	9 059.23	0	1	2 264.8	0.4	905.93	1.4	3170.73	2.6	5 886.5
2.1	06-1-01-06-0011	Кирпич силикатный полнотелый 190х90х85	т	1.904	29 690.06	0	0.476	7 422.52	0.1904	2 969.01	0.6664	10391.53	1.2376	19 298.53
3	07-01-001-01	Укладка блоков и плит пенобетонных	100 шт	0.03	2 116.99	0	0.0075	529.23	0.003	211.71	0.0105	740.94	0.0195	1 376.05
3.1	02-3-01-02-1102	Песок природный для строительных	м3	0.288	187.26	0	0.072	46.81	0.0288	18.73	0.1008	65.54	0.1872	121.72
3.2	05-1-05-04-0006	Плиты железобетонные ленточные	м3	3	40 762.5	0	0.75	10 190.63	0.3	4 076.25	1.05	14266.88	1.95	26 495.62
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	м10-01-001-09	Плата с реле с включением	шт	4	185.66	0	1	46.42	0.4	18.56	1.4	64.98	2.6	120.68
5.1	421/пр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомогательных %		8	0	0	2	0	0.8	0	2.8	0	5.2	0
6	м23-01-002-09	Машина крупильная сибирского типа	шт	7	1 235 750.51	0	1.75	308 937.63	0.7	123 575.04	2.45	432512.67	4.55	803 237.84
6.1	421/пр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомогательных %		14	0	0	3.5	0	1.4	0	4.9	0	9.1	0
6.2	999-0005	Масса оборудования	т	399.7	0	0	99.925	0	39.97	0	139.895	0	259.805	0
Раздел №2														
7	м08-01-001-01	Трансформатор трехфазный 35 кВ	шт	5	41 721.4	0	1.25	10 430.33	0.5	4 172.12	1.75	14602.45	3.25	27 118.95
7.1	421/пр_2020_л_75_	Сметная стоимость вспомогательных %		10	0	0	2.5	0	1	0	3.5	0	6.5	0
8	м03-01-002-09	Вентилятор осевой с поворотными	шт	7	0	0	1.75	0	0.7	0	2.45	0	4.55	0
9	м03-01-002-14	Вентилятор радиальный	шт	7	0	0	1.75	0	0.7	0	2.45	0	4.55	0
Итого					1 382 410.66	0		345 602.61		138 241.03		483 843.64		898 567.02
Табличный вид Предпросмотр														

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать"

Доступные документы

Журнал учёта выполненных работ (КС-6) [0 из 3]

☐	Журнал учёта выполненных работ КС-6	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Форма № КС-6а	ООО "Фирма СтройСофт"
☐	Форма № КС-6а (Старая)	ООО "Фирма СтройСофт"

Сформировать Отмена Обновить Настроить >>

Перед экспортом в Excel/PDF можно воспользоваться функцией предварительного просмотра документа. Для этого перейдите на вкладку "Предпросмотр"

